


荒久海岸人工リーフ整備工事


～高潮による市街地への被害を軽減することを目的に工事を進めています。～



工事写真

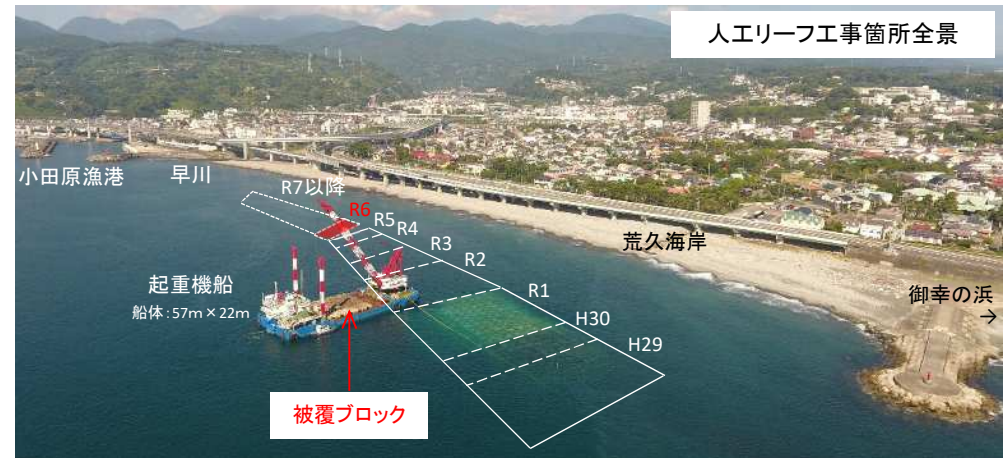


人工リーフ工事箇所全景

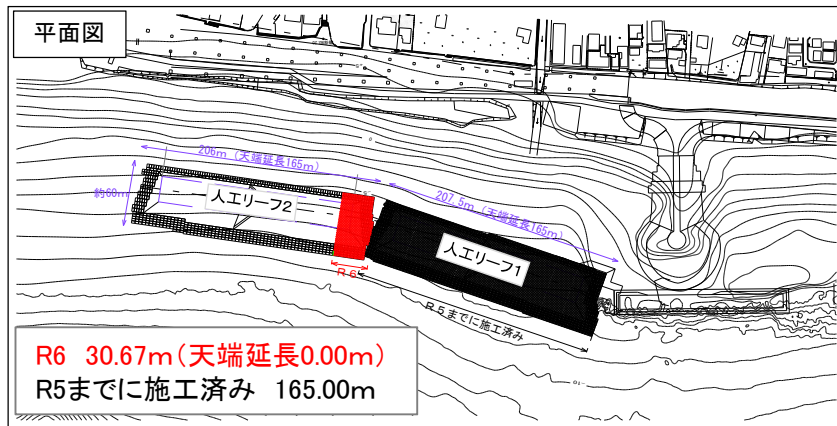

被覆ブロック(16t)



据付状況

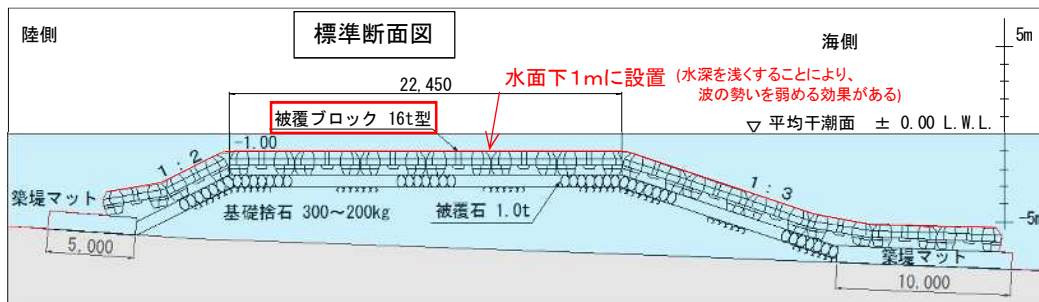

【工事の進捗状況および今後の予定】

平成29年度～令和5年度: L=207.50m(天端延長 L=165.00m)

令和6年度: L=30.67m(天端延長 L=0.00m)

令和7年度以降: 早期の完成を目指して順次工事を進めていく予定です。

工事時期(海上)は毎年2月～7月頃を予定しています。
