



二級河川葛川河川改修工事の進捗状況について(令和8年1月下旬時点)

令和7年度は、河床掘削工事の約0.3km区間のうち、新田橋付近の0.14kmを実施しています。

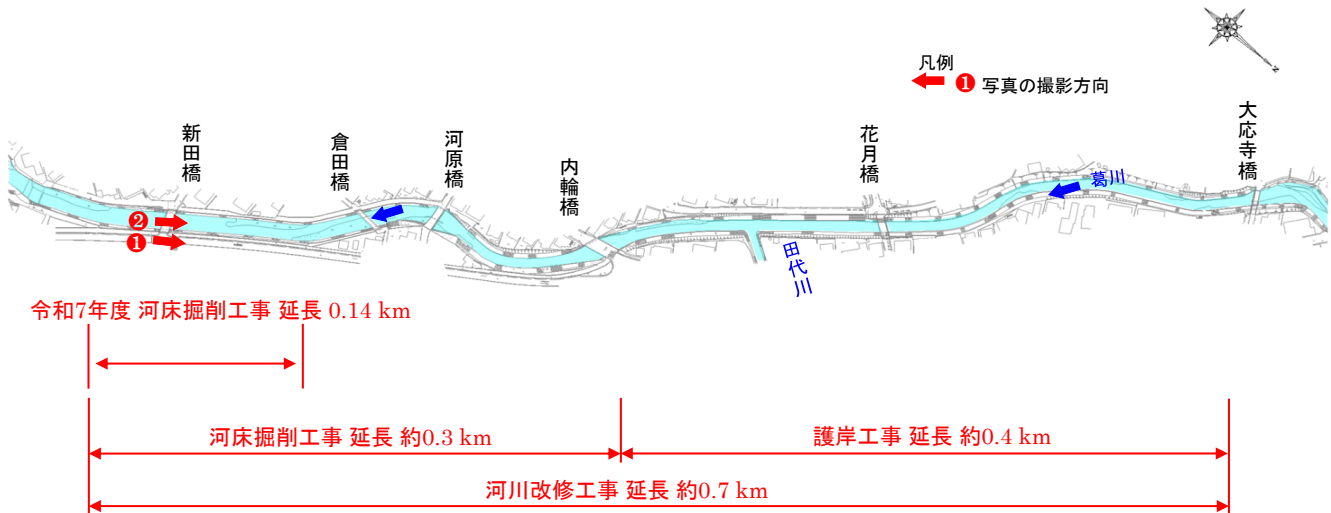

標準横断面図 (イメージ図)

河床掘削工事
新田橋下流～内輪橋 約0.3km

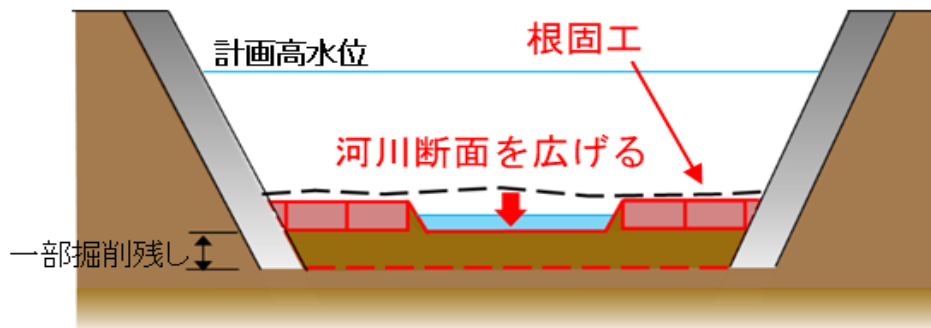

工事の進め方


ステップ1 左岸側から根固工を施工します。

ステップ2 左岸側の根固工が完了した後、右岸側の根固工を施工します。

ステップ3 両岸の根固工が完了した後、川の中央部を掘削して、本工事は完成となります。

※上流より下流を見て左側が左岸・右側が右岸

下の写真は、ステップ1の施工状況です。

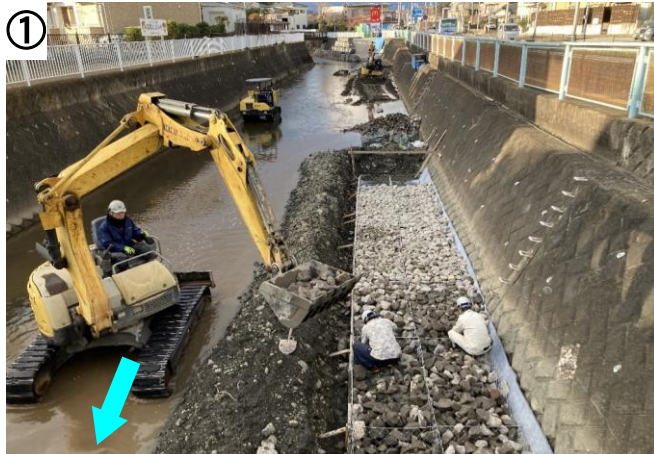

①の写真は、左岸側の根固工の施工状況で、かごマットという鋼製のかごに割栗石を敷詰めている様子です。




②の写真は、1月16日(金)に左岸側の根固工が完成した時の状況です。

下の写真は、ステップ2の施工状況です。



③の写真では、右岸側に根固工を施工するために、河床を掘削しています。

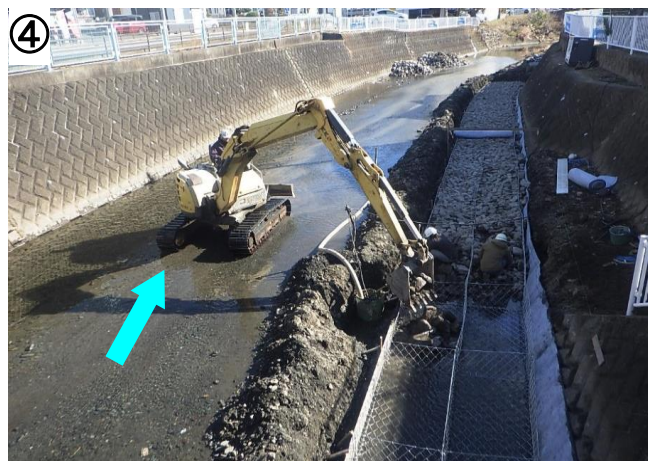

④の写真では、左岸側の根固工が完成しており、右岸側の根固工を施工するため、かごマットに割栗石を敷詰めています。

※ 現在、右岸側の根固工を鋭意施工しており、2月中旬頃にステップ2が完了する予定です。
