



二級河川葛川河川改修工事の進捗状況について(令和8年1月中旬時点)

令和7年度は、河床掘削工事の約0.3km区間のうち、新田橋付近の0.14kmを実施しています。

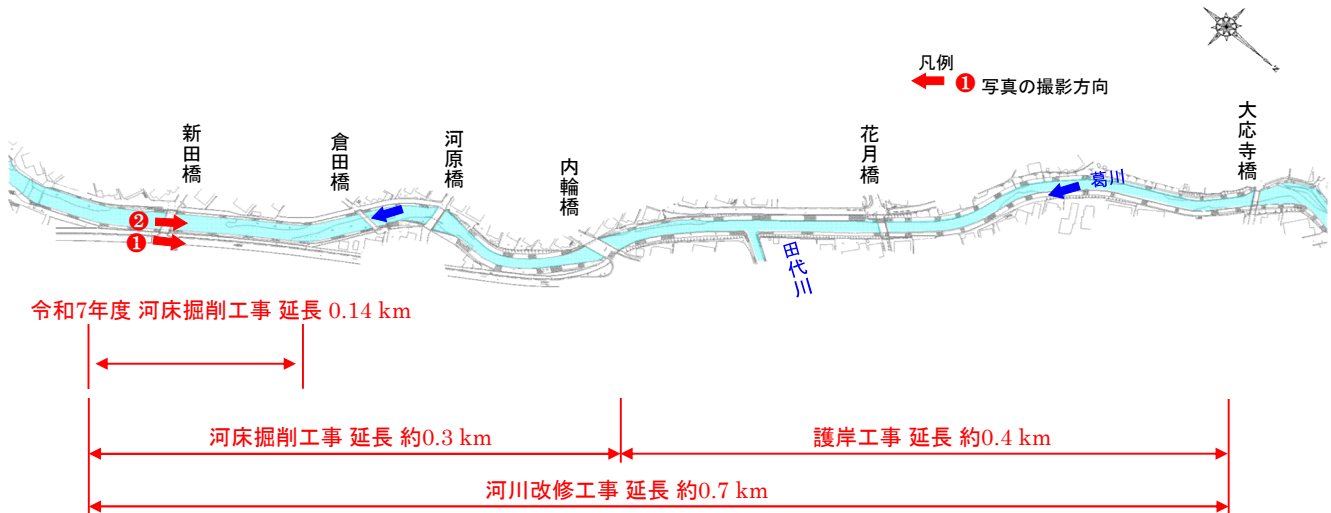

標準横断面図 (イメージ図)


河床掘削工事
新田橋下流～内輪橋 約0.3km

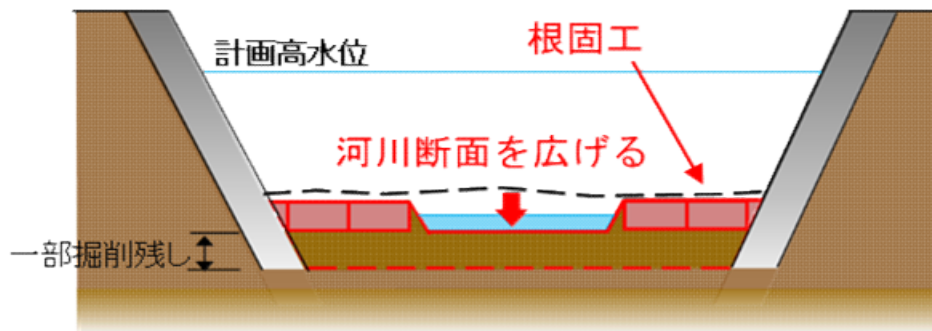

工事の進め方

- ① 左岸側から根固工を施工します。
- ② 左岸側の根固工が完了した後、右岸側の根固工を施工します。
- ③ 両岸の根固工が完了した後、川の中央部を掘削して、本工事は完成となります。

下の写真は、これまでの施工状況です。

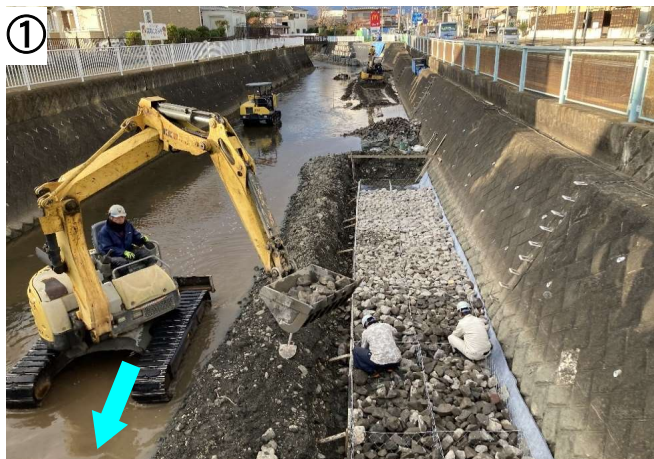

①の写真は、左岸側の根固工の施工状況で、かごマットという鋼製のかごに割栗石を敷詰めている様子です。



②の写真は、1月16日(金)に左岸側の根固工が完成した時の状況です。

※ 現在は、右岸側の根固工を施工するため、掘削工事を行っており、一定程度掘削が完了した後、根固工を設置していきます。
