



二級河川葛川河川改修工事の進捗状況について(令和8年3月上旬時点)

令和7年度は、河床掘削工事の約0.3km区間のうち、新田橋付近の0.14kmを実施しています。

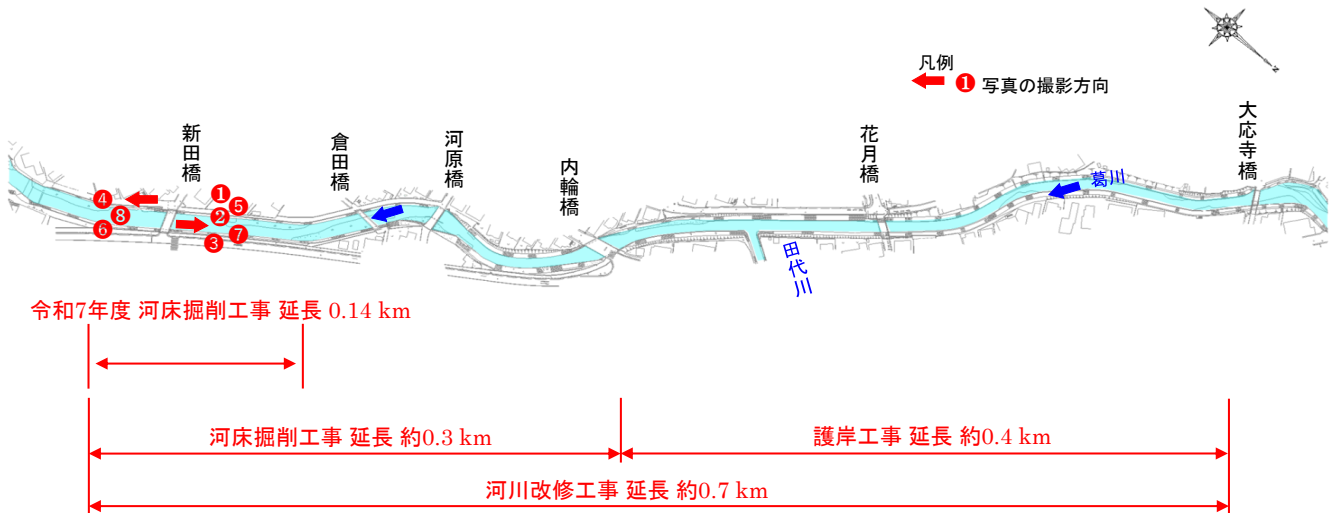

標準横断面図 (イメージ図)


河床掘削工事
新田橋下流～内輪橋 約0.3km



工事の進め方

- ステップ1 左岸側から根固工を施工します。
 - ステップ2 左岸側の根固工が完了した後、右岸側の根固工を施工します。
 - ステップ3 両岸の根固工が完了した後、川の中央部を掘削して、本工事は完成となります。
- ※上流より下流を見て左側が左岸・右側が右岸

下の写真は、ステップ1の施工状況です。




①の写真は、左岸側の根固工の施工状況で、かごマットという鋼製のかごに割栗石を敷詰めている様子です。



②の写真は、1月16日(金)に左岸側の根固工が完了した時の状況です。

下の写真は、ステップ2の施工状況です。



③の写真では、右岸側に根固工を施工するために、河床を掘削しています。



④の写真では、左岸側の根固工が完了しており、右岸側の根固工を施工するため、かごマットに割栗石を敷詰めています。

下の写真は、ステップ3の施工状況です。



⑤の写真では、新田橋上流部において右岸側の根固工が完了し、川の中央部の掘削を行っています。



⑥の写真では、新田橋下流部において川の中央部の掘削が完了しました。

下の写真は、今回の工事が完成した状況です。



⑦の写真は、新田橋上流側の状況です。



⑧の写真は、新田橋下流側の状況です。

※ 引き続き、令和8年度以降も工事を実施していきます。
