

## 県道63号（相模原大磯）吾妻橋の架替事業に関するお知らせです

日ごろより、吾妻橋架替事業に多大なるご理解ご協力をいただき深く感謝申し上げます。

本事業は、平成24年度に仮橋工事に着手し、現在は、交通を仮橋の方に切り回すための迂回路整備工事を行っております。11月中旬に、交通を仮橋へ切り回す予定としておりますので、その内容や今後の工事予定をお知らせいたします。

## 1 仮橋（迂回路）への交通の切り回しについて

## 1) 交通切り回しの時期

現在、吾妻橋交差点（金目川左岸）の迂回路整備工事を鋭意進めています。交通を仮橋へ切り回す時期は、11月中旬を予定しています。具体の日時は、決まり次第、工事看板などでお知らせします。

## 2) 切り回し内容

切り回し後の交差点位置は、現在の吾妻橋交差点位置より約40m東に移動します。このため、車のルートや歩行者・自転車のルートが変わります。詳しくは、裏面の図面をご参照ください。なお、今回交通を切り回した後は、新しい橋が完成供用されるまでルートの変更を行わない予定です。

## 2 今後の工事予定

## 1) 平成26年度

吾妻橋を撤去する工事と新しい橋の下部工を設置する工事（下記①）に着手します。また、吾妻橋前後（金目川左右岸側）の道路改良工事（下記②）を、昨年度に引き続き進めてまいります。

番号	工事名	請負業者	現場代理人	連絡先
①	平成26年度 道路改良工事 公共（その1） 橋りょう整備工事 県単（その5）合併	株式会社 日本ビオトープ	片島 健一郎	0463-20-8658 (会社)
②	平成24年度 橋りょう整備工事 県単（その24） 平成25年度 道路改良工事 公共（その1） 橋りょう整備工事 県単（その4）合併	株式会社 勝工務店	西田 勇	0463-24-3811 (会社)

## 2) 平成27年度以降



平成27年度から平成29年度にかけて、新しい橋の下部工および上部工の工事を進め、平成29年度中の新しい橋の完成供用を予定しています。

なお、新しい橋を供用した後、迂回路や仮橋の撤去を行いますので、事業全体の完了時期は平成30年度になる予定です。

## 3 その他

次回の「吾妻橋だより（第4号）」は、来年10月頃の発行を予定しています。なお、吾妻橋架替事業に関してご不明な点などがございましたら、裏面の連絡先までいつでもお問い合わせください。

# 交通の切り回しについて

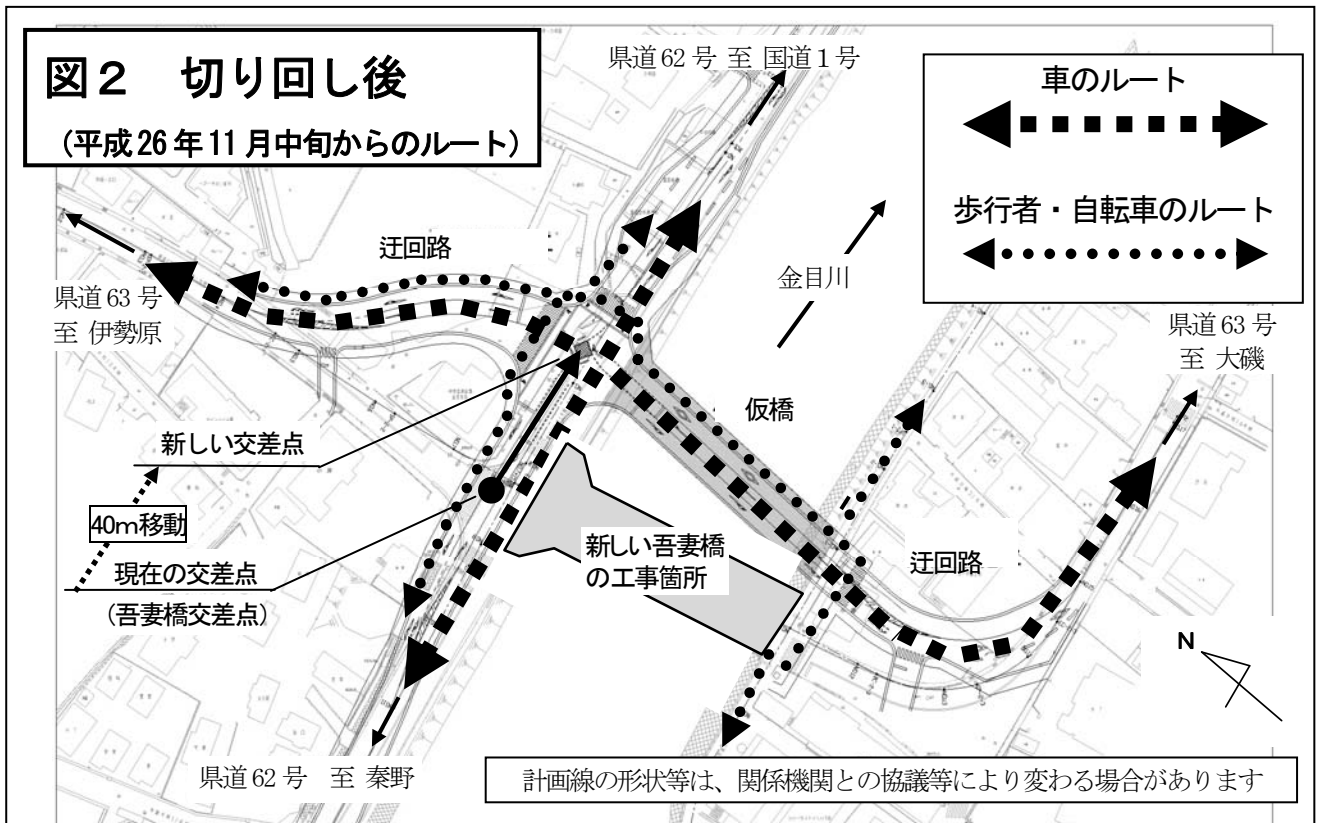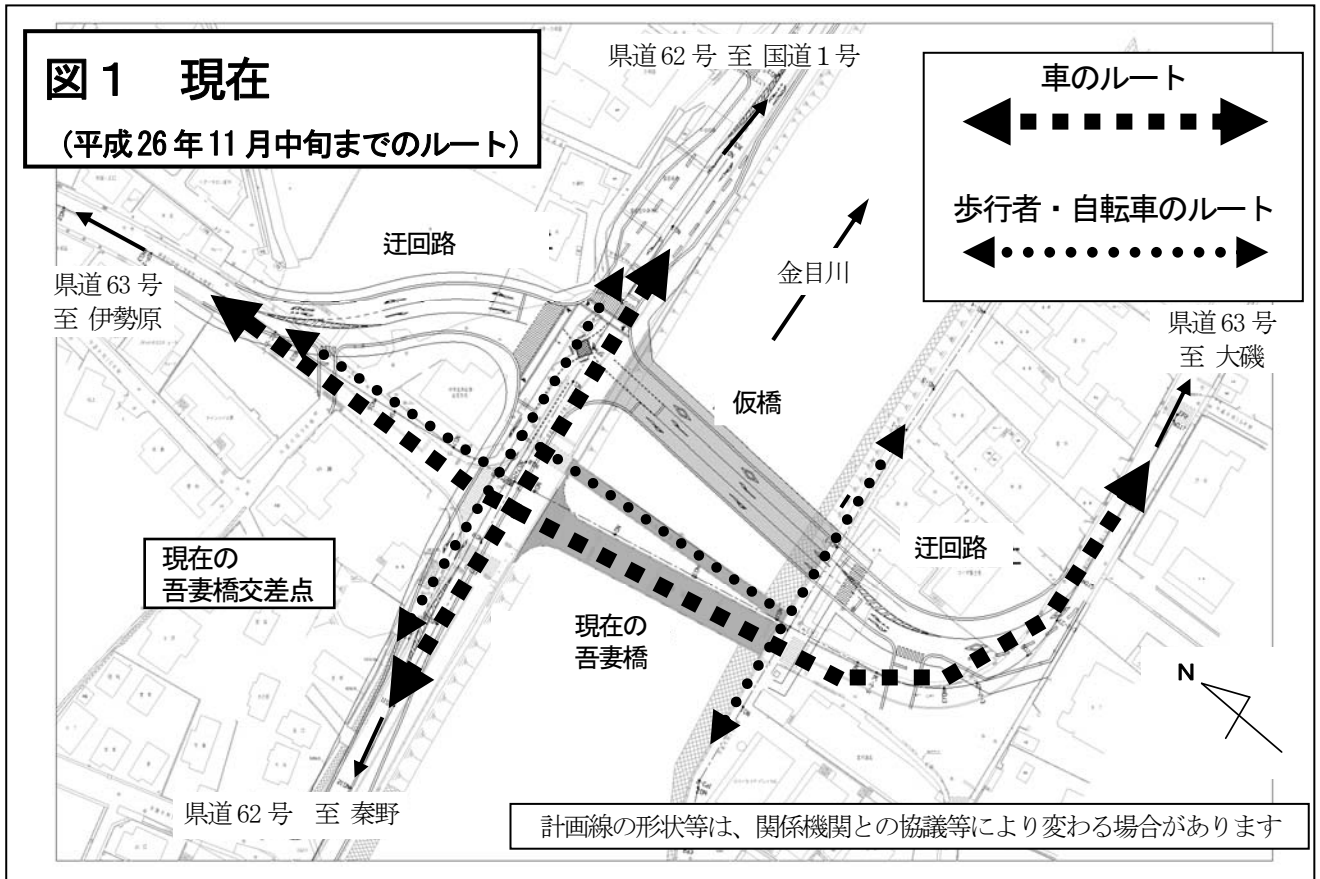

吾妻橋架替事業に関するご質問等がございましたら、  
 神奈川県平塚土木事務所 道路都市課 街路・橋りょう班  
 電話 0463 (22) 2711 内線 4083, 4084 まで、お問い合わせください。
