

平成26年度相模川流域下水道建設事業決算見込について

相模川流域下水道事業連絡協議会
幹事会 資料

平成26年度 相模川流域下水道建設事業決算見込について

(1) 事業費内訳

(単位：千円)

内 訳	2月現計 (A)					決算見込 (B)					差 額 (C) = (B) - (A)					備 考
	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	1,662,365	328,869	617,360	2,436	2,611,030	1,662,335	328,858	617,341	2,436	2,610,970	30	11	19	0	60	
単独事業	0	116,848	10,463	111	127,422	0	113,663	10,378	111	124,152	0	3,185	85	0	3,270	
合 計	1,662,365	445,717	627,823	2,547	2,738,452	1,662,335	442,521	627,719	2,547	2,735,122	30	3,196	104	0	3,330	

平成26年度 相模川流域下水道建設事業決算見込について

(2) 市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	2月現計(A)			決算見込(B)			差額(C) = (B) - (A)			備 考
	公共事業	単独事業	計	公共事業	単独事業	計	公共事業	単独事業	計	
相 模 原 市	201,578	3,417	204,995	201,573	3,389	204,962	5	28	33	差額については、平成28年度当初予算で調整予定
平 塚 市	93,836	1,590	95,426	93,833	1,577	95,410	3	13	16	〃
藤 沢 市	7,716	131	7,847	7,716	130	7,846	0	1	1	〃
茅 ヶ 崎 市	66,056	1,119	67,175	66,054	1,110	67,164	2	9	11	〃
厚 木 市	90,997	1,542	92,539	90,994	1,529	92,523	3	13	16	〃
伊 勢 原 市	13,335	226	13,561	13,334	225	13,559	1	1	2	〃
海 老 名 市	45,190	766	45,956	45,189	760	45,949	1	6	7	〃
座 間 市	34,324	582	34,906	34,323	577	34,900	1	5	6	〃
綾 瀬 市	10,248	173	10,421	10,246	172	10,418	2	1	3	〃
寒 川 町	24,262	412	24,674	24,262	408	24,670	0	4	4	〃
大 磯 町	9,630	163	9,793	9,630	162	9,792	0	1	1	〃
愛 川 町	20,188	342	20,530	20,187	339	20,526	1	3	4	〃
小 計 (A)	617,360	10,463	627,823	617,341	10,378	627,719	19	85	104	
県 (B)	328,869	116,848	445,717	328,858	113,663	442,521	11	3,185	3,196	
(A) + (B)	946,229	127,311	1,073,540	946,199	124,041	1,070,240	30	3,270	3,300	
国 費	1,662,365	0	1,662,365	1,662,335	0	1,662,335	30	0	30	
繰 越 金	2,436	111	2,547	2,436	111	2,547	0	0	0	
合 計	2,611,030	127,422	2,738,452	2,610,970	124,152	2,735,122	60	3,270	3,330	

平成26年度 相模川流域下水道建設事業決算見込について


(3) 事業内容について

上段:2月現計
下段:決算見込

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内 容	備 考	図面	
1 公 共	(1)幹線・ポンプ場	139,061 137,170	過年度発注 26年度新規発注(新設) ・寒川平塚幹線水理実験委託(H26)	(改築) ・門沢橋ポンプ場受変電設備改築工事(H26) ・太井ポンプ場他監視設備改築工事設計業務委託(H26)		
	(2)左岸処理場	2,471,969 2,473,800	過年度発注 ・汚泥脱水機設備改築工事(H25-H26) ・第2電気室設備改築工事(H25-H26)	26年度新規発注(新設) ・上部利用施設管理用倉庫新築工事(H26) ・場内整備工事(H26) ・水処理第6系列最終沈澱池蓋掛工事(H26)	(改築) ・水処理第1系列設備改築工事(H26-H27) ・汚泥処理煉脱臭設備改築工事(H26-H27) ・送風機設備改築工事(H26-H27) ・特別高圧受変電設備改築工事(H26-H28) ・雨水沈殿池耐震工事(H26) ・管理棟設備改築工事(H26) ・設計委託(H26)	
	(3)右岸処理場	2,471,969 2,473,800	過年度発注 ・水処理監視設備改築工事(H25-H26)	26年度新規発注(新設)	(改築) ・送風機設備改築工事(H26-H27) ・水処理4系列監視設備改築工事(H26-H27) ・低段No.1,3汚水ポンプ電動機設備改築工事(H26-H27) ・設計委託(H26)	
	計	2,611,030 2,610,970				
2 単 独	(1)幹線・ポンプ場	0 0				
	(2)左岸処理場			・建築確認申請手数料等(H26) ・消火設備設置(H26)		
	(3)右岸処理場	21,148 20,978				
	(4)汚泥貯留地			・上部利用施設整備工事[硬式野球場](H26) ・図面作成委託(H26)		
	小計(工事費)	21,148 20,978				
	(5)公共事業事務費	106,274 103,174		・担当職員給与,手当,共済費,事務経費		
計	127,422 124,152					
総事業費		2,738,452 2,735,122				


平成26年度 相模川流域下水道事業 計画平面図

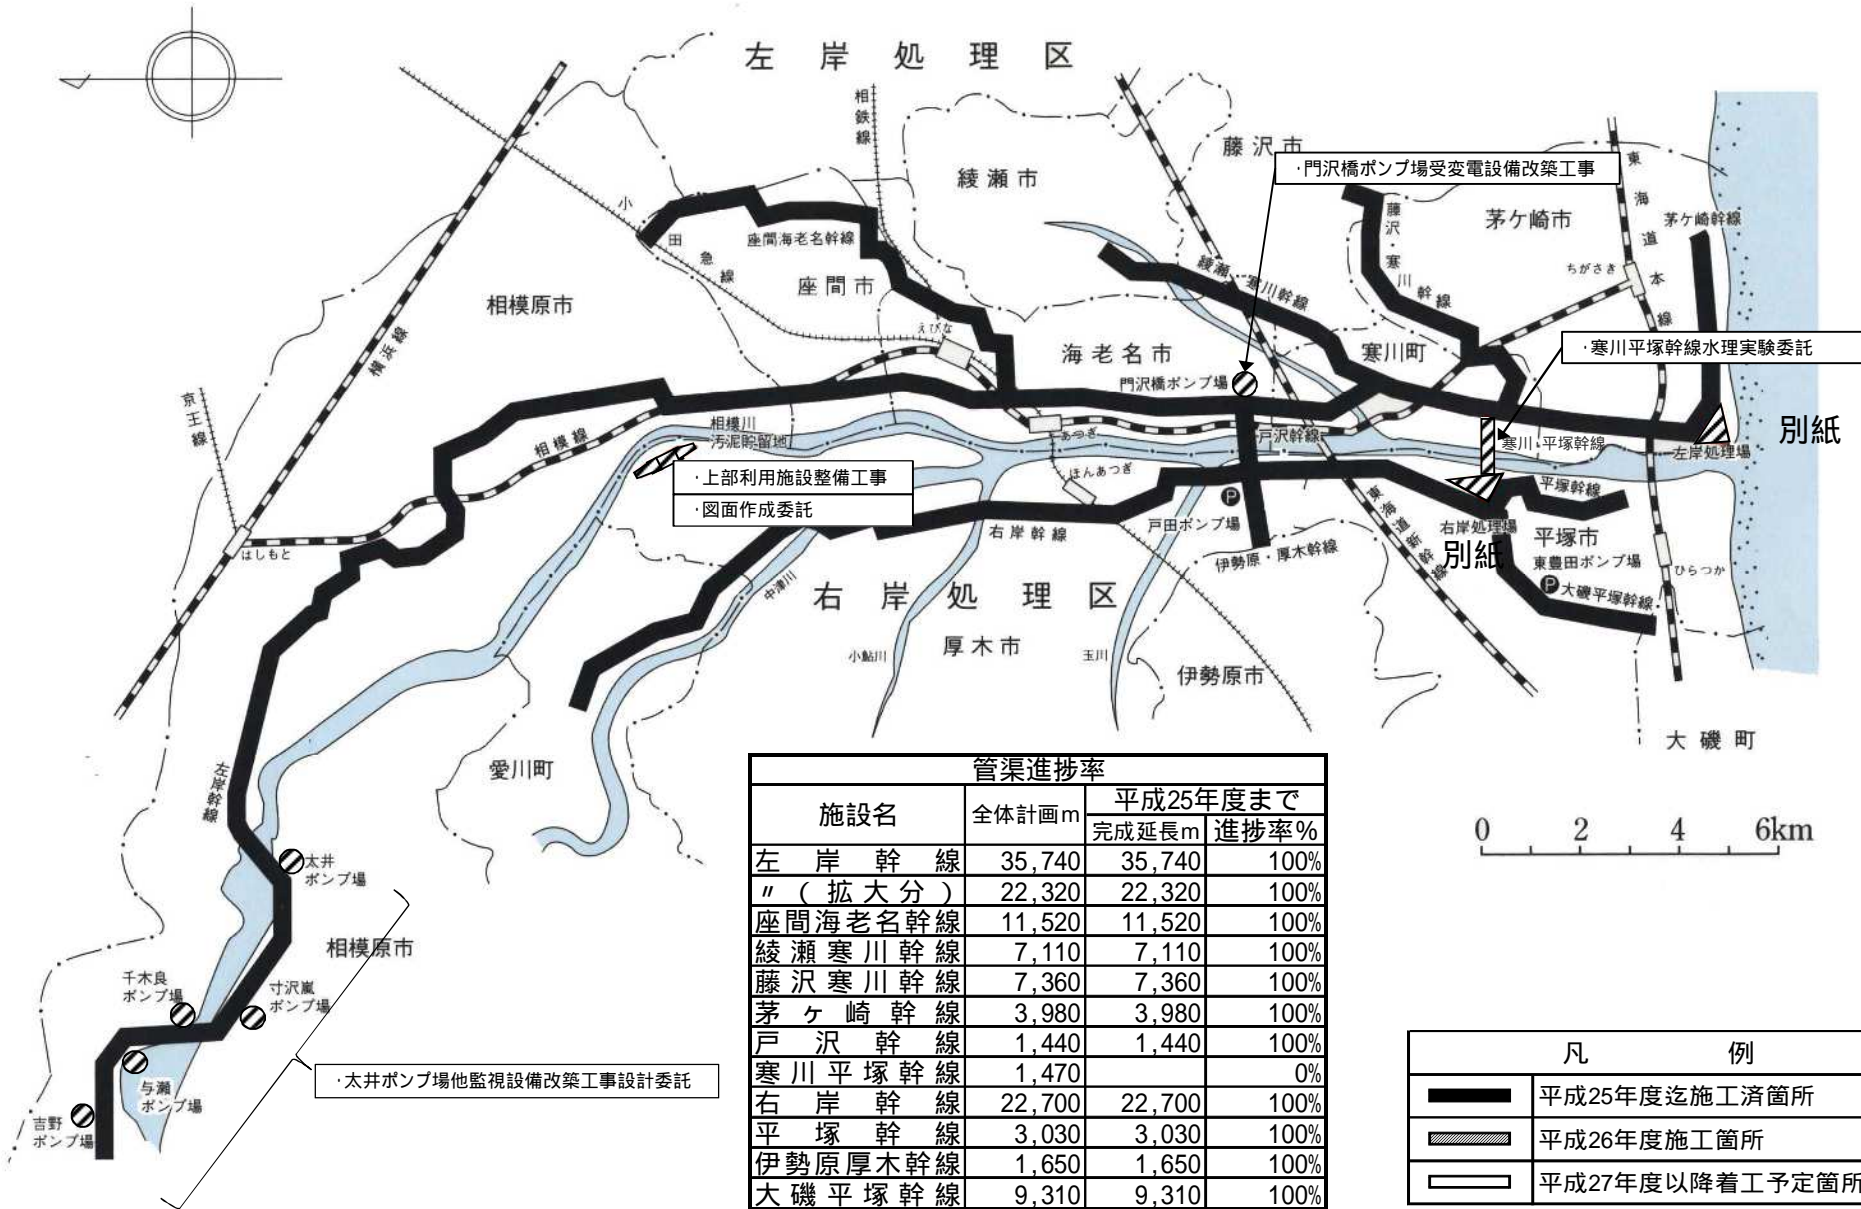

施設名	全体計画m	平成25年度まで	
		完成延長m	進捗率%
左岸幹線	35,740	35,740	100%
〃（拡大分）	22,320	22,320	100%
座間海老名幹線	11,520	11,520	100%
綾瀬寒川幹線	7,110	7,110	100%
藤沢寒川幹線	7,360	7,360	100%
茅ヶ崎幹線	3,980	3,980	100%
戸沢幹線	1,440	1,440	100%
寒川平塚幹線	1,470		0%
右岸幹線	22,700	22,700	100%
平塚幹線	3,030	3,030	100%
伊勢原厚木幹線	1,650	1,650	100%
大磯平塚幹線	9,310	9,310	100%

凡 例	
	平成25年度迄施工済箇所
	平成26年度施工箇所
	平成27年度以降着工予定箇所

平成26年度 相模川流域下水道 左岸処理場 計画平面図

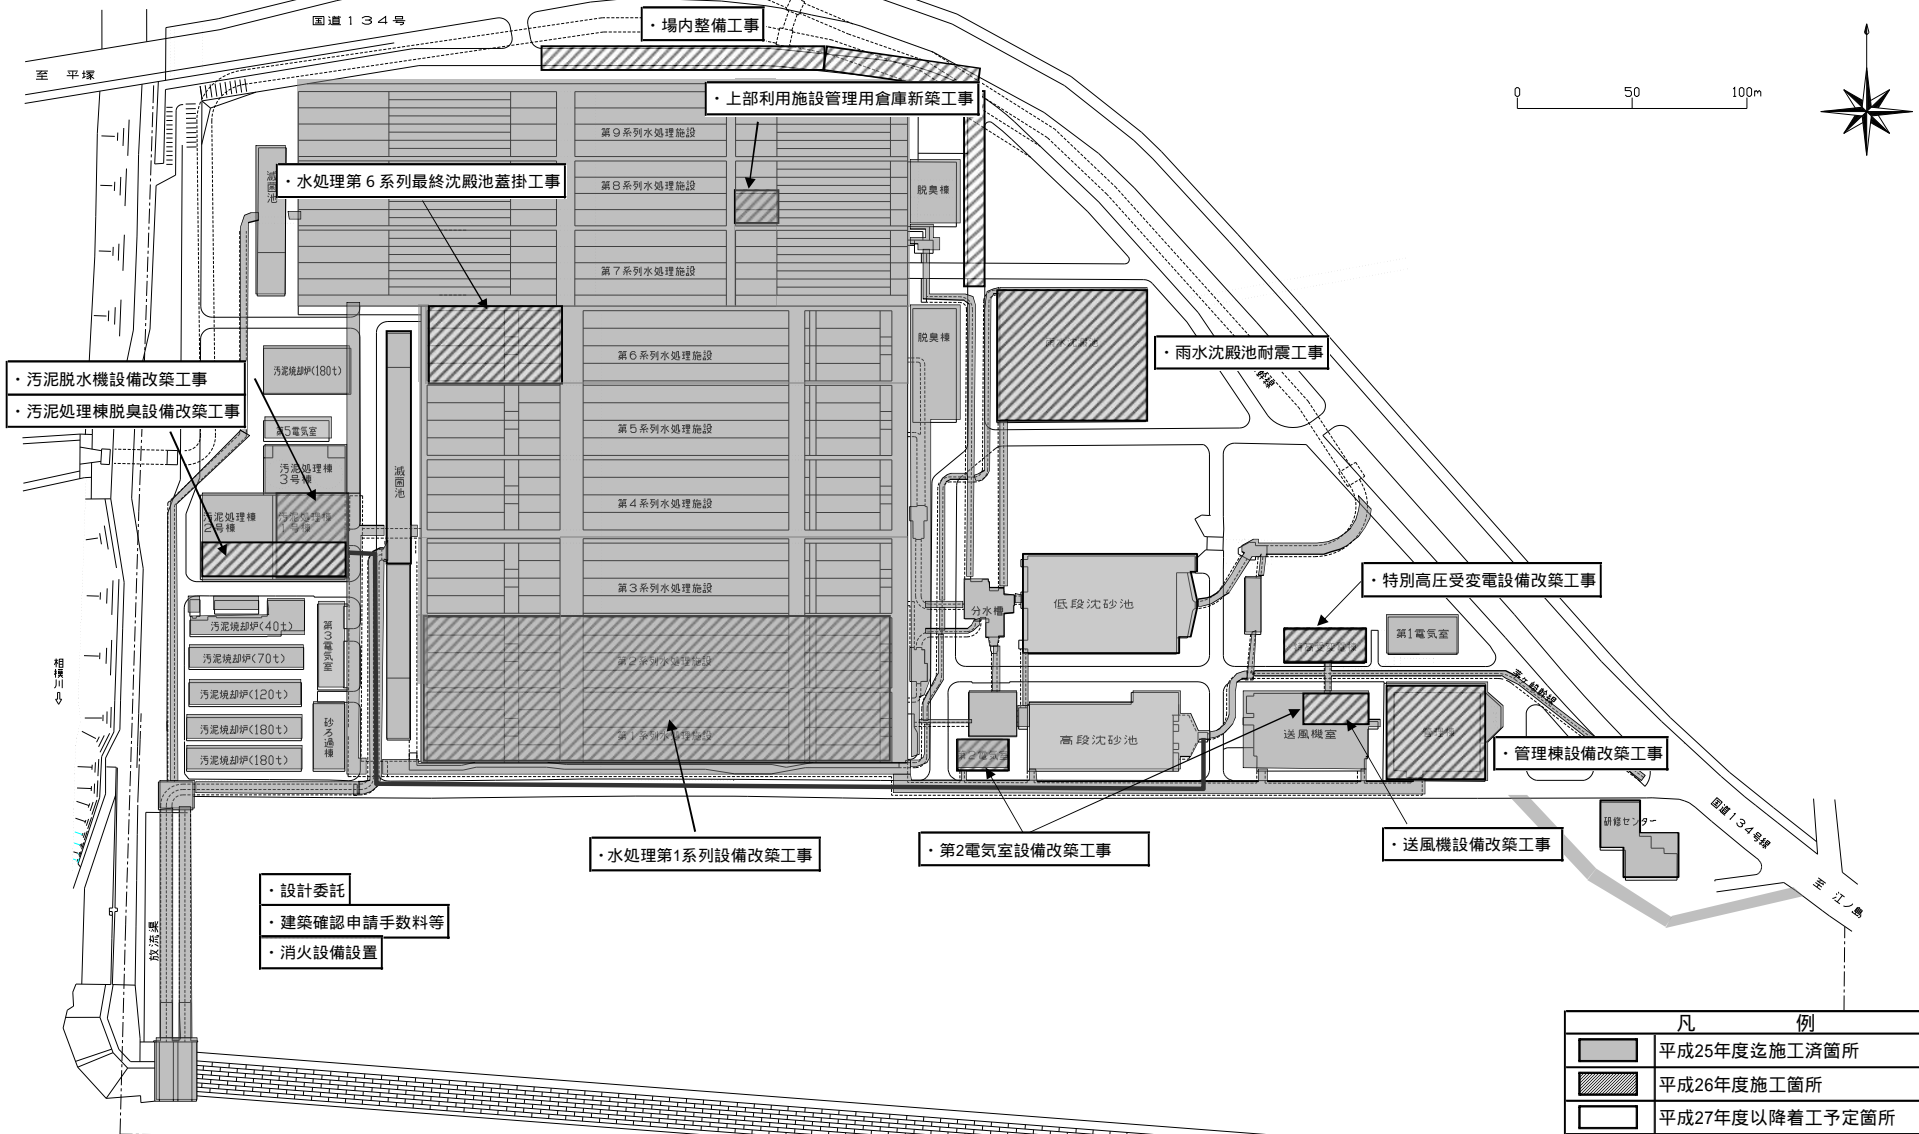

平成26年度 相模川流域下水道 右岸処理場 計画平面図

