


矢上川地下調節池トンネル本体 I 期工事 地表面変位測定結果のお知らせ

測定日：12月23日(火)

シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果

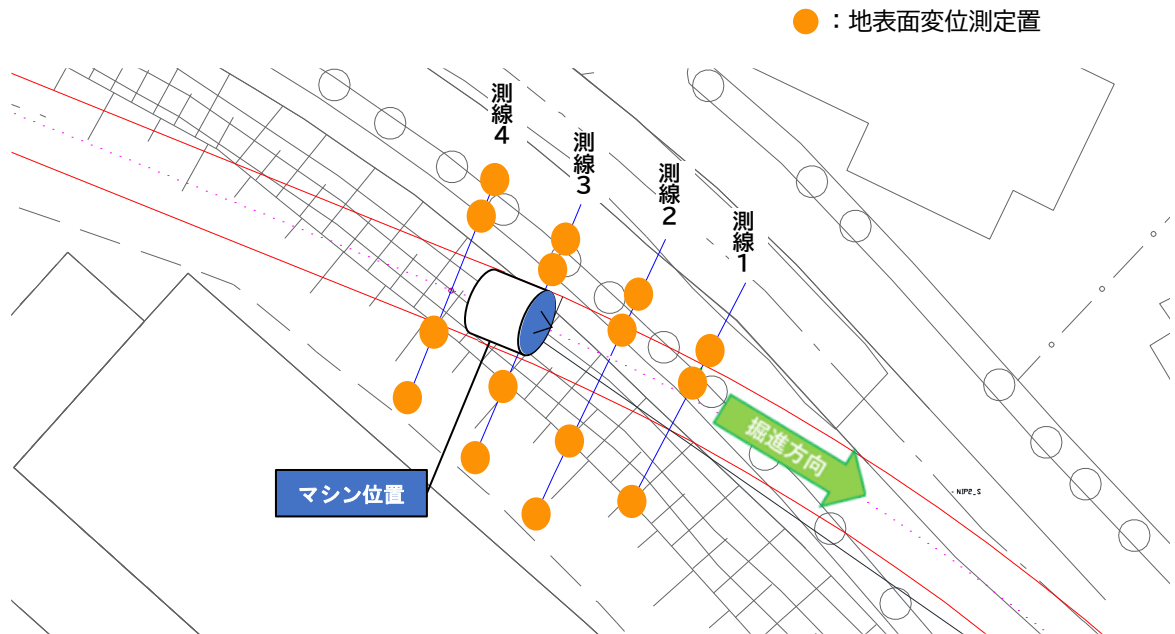

◆測定結果

測線	初期値 (m)	測定値 (m)	最大鉛直変位 (mm)
1	21.861	21.863	+ 2
2	15.070	15.072	+ 2
3	15.149	15.150	+ 1
4	15.304	15.303	- 1

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
