


矢上川地下調節池トンネル本体 I 期工事 地表面変位測定結果のお知らせ

測定日：10月28日(火)

シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果

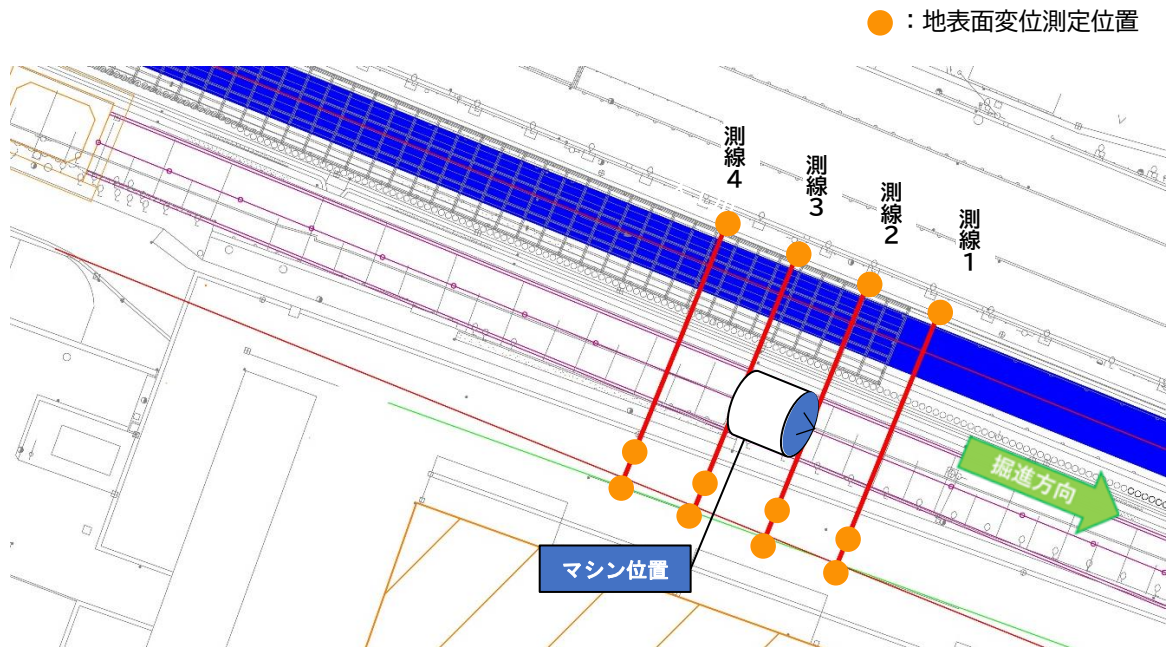

◆測定結果

測線	初期値 (m)	測定値 (m)	最大鉛直変位 (mm)
1	21.832	21.834	+ 2
2	21.842	21.844	+ 2
3	15.831	15.830	- 1
4	21.723	21.721	- 2

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
