


**矢上川地下調節池トンネル本体 I 期工事  
地表面変位測定結果のお知らせ**

測定日：5月26日(火)

**シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果**

●：地表面変位測定置

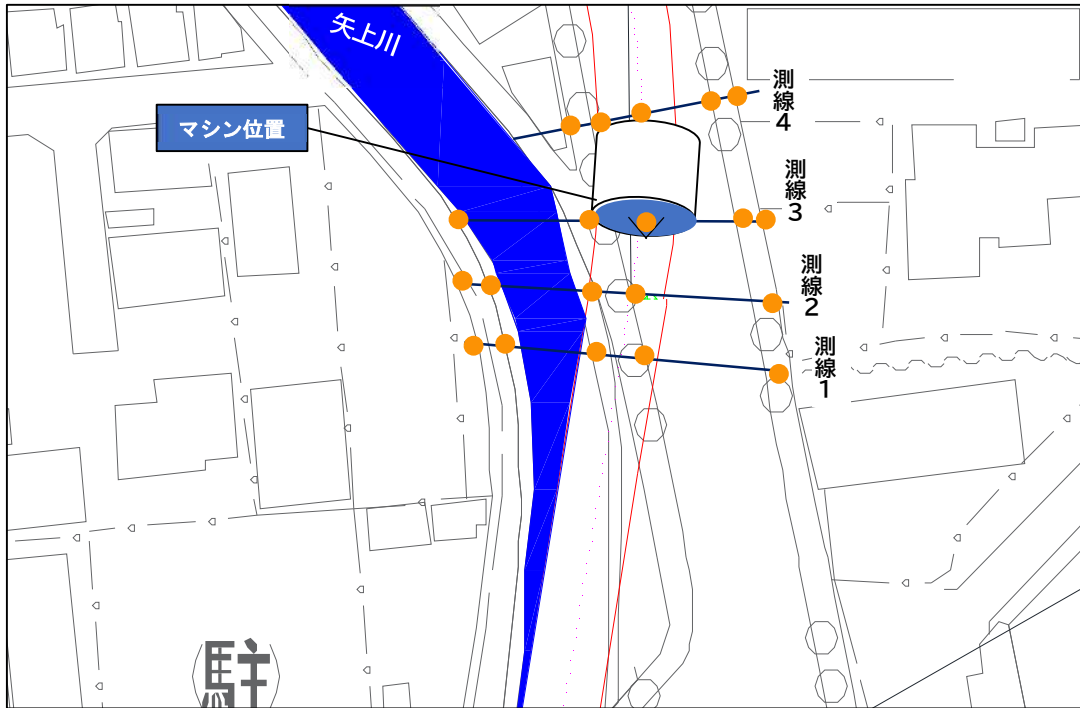

◆測定結果

測線	初期値 (m)	測定値 (m)	最大鉛直変位 (mm)
1	11.941	11.940	- 1
2	11.583	11.587	+ 4
3	11.946	11.945	- 1
4	11.522	12.524	+ 2

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
