


矢上川地下調節池トンネル本体 I 期工事 地表面変位測定結果のお知らせ

測定日：7月1日(火)

シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果

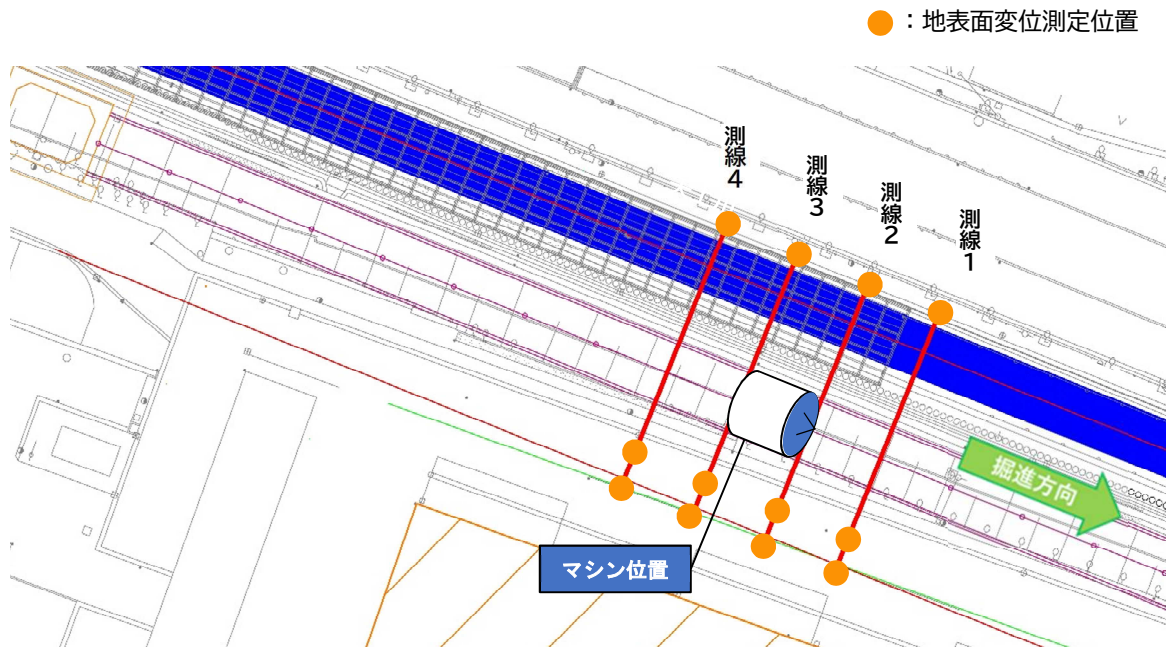

◆測定結果

測線	初期値 (m)	測定値 (m)	最大鉛直変位 (mm)
1	15.775	15.774	-1
2	15.774	15.773	-1
3	15.831	15.830	-1
4	14.150	14.148	-2

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
