


矢上川地下調節池トンネル本体 I 期工事 地表面変位測定結果のお知らせ

測定日：5月7日(水)

シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果

●：地表面変位測定位置

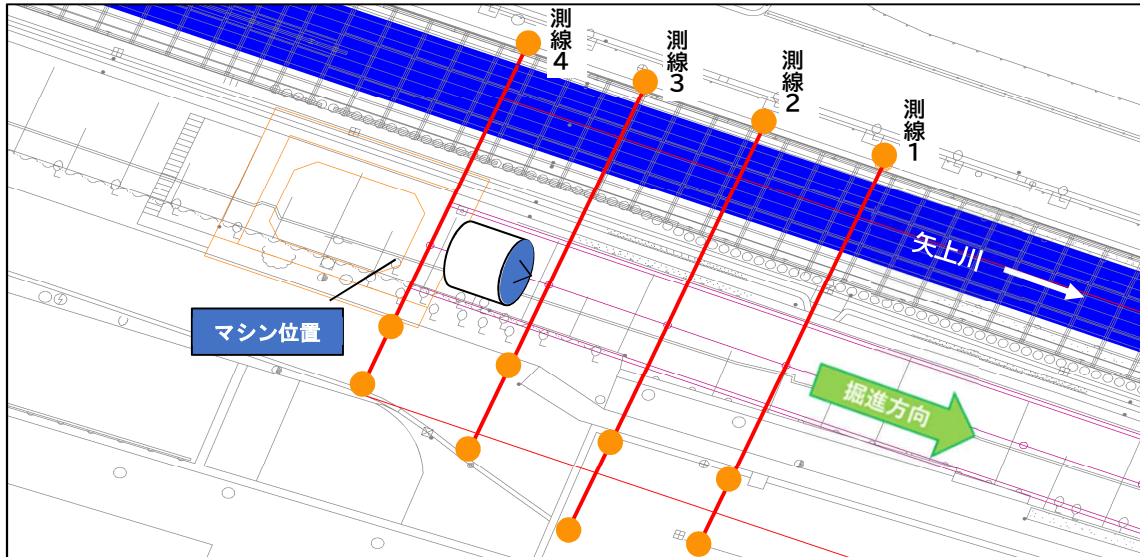

◆測定結果

測線	初期値 (m)	測定値 (m)	最大鉛直変位 (mm)
1	21.847	21.846	-1
2	21.747	21.746	-1
3	15.895	15.897	+2
4	21.787	21.786	-1

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
