


矢上川地下調節池トンネル本体 I 期工事 地表面変位測定結果のお知らせ

測定日：6月3日(火)

シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果

●：地表面変位測定位置

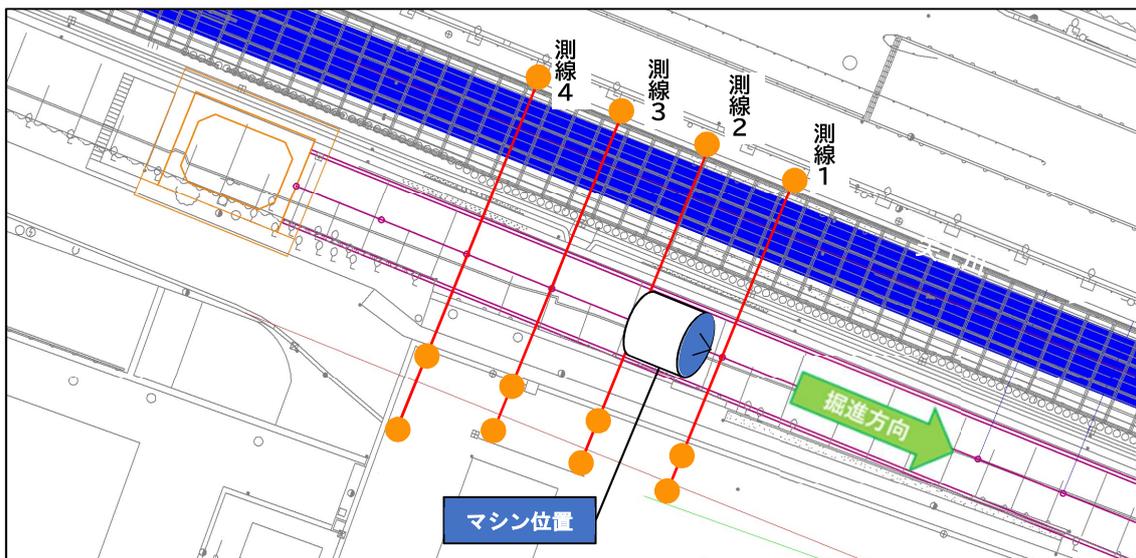

◆測定結果

| 測線 | 初期値 (m) | 測定値 (m) | 最大鉛直変位 (mm) |
|----|---------|---------|-------------|
| 1 | 21.831 | 21.832 | +1 |
| 2 | 15.798 | 15.798 | ±0 |
| 3 | 15.797 | 15.798 | +1 |
| 4 | 15.816 | 15.818 | +2 |

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
