


矢上川地下調節池トンネル本体Ⅰ期工事 地表面変位測定結果のお知らせ

測定日：6月17日(火)

シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果

●：地表面変位測定位置

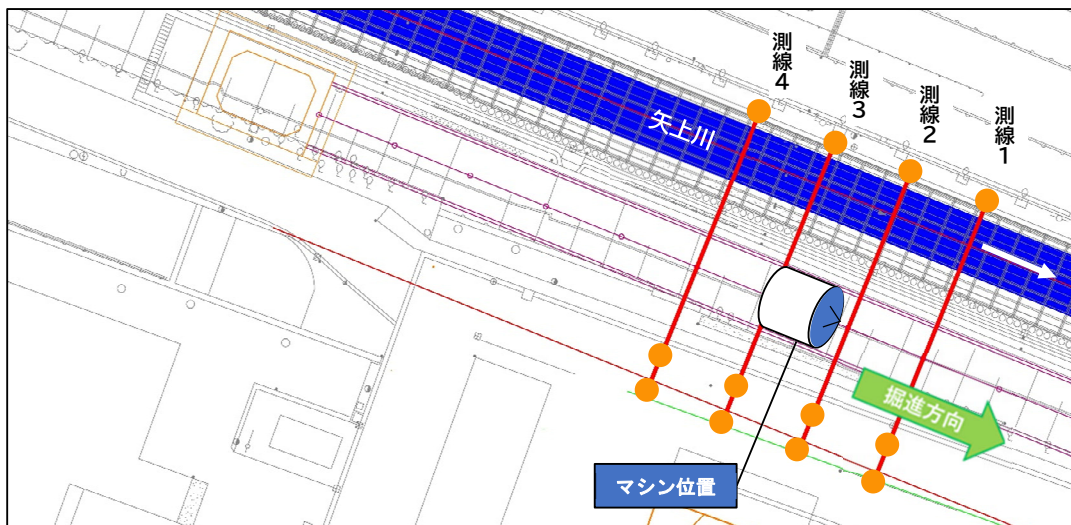

◆測定結果

測線	初期値 (m)	測定値 (m)	最大鉛直変位 (mm)
1	15.772	15.771	-1
2	21.833	21.834	+1
3	15.790	15.789	-1
4	15.775	15.774	-1

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
