資料１

臨時会報告事項１

令和７年度　相模川流域下水道建設事業決算見込について

相模川流域下水道事業連絡協議会

令和7年度　相模川流域下水道建設事業決算見込について

(1) 事 業 費 内 訳

（単位：千円）

内 訳	2月現計予算(A)					決算(B)					不用額(C)＝(A)－(B)					令和6年度からの繰越予算に係る不用額	備 考
	財源内訳				建設改良費	財源内訳				建設改良費	財源内訳				建設改良費		
	国 費	県負担	市町負担	繰越金		国 費	県負担	市町負担	繰越金		国 費	県負担	市町負担	繰越金			
公共事業	1,297,694	484,932	484,931	-	2,267,557	1,262,625	467,398	467,397	-	2,197,420	35,069	17,534	17,534	-	70,137	3,212	
単独事業	-	226,512	226,511	-	453,023	-	226,512	226,511	-	453,023	-	0	0	-	0	-	
備品購入費	-	4,049	3,569	481	8,099	-	2,575	2,053	481	5,109	-	1,474	1,516	0	2,990	-	
建設給与費・事務費	-	224,369	154,262	6,893	385,524	-	133,989	88,547	6,893	229,429	-	90,380	65,715	0	156,095	-	
合 計	**1,297,694**	**939,862**	**869,273**	**7,374**	**3,114,203**	**1,262,625**	**830,474**	**784,508**	**7,374**	**2,884,981**	**35,069**	**109,388**	**84,765**	**0**	**229,222**	**3,212**	

※　決算(B)における金額は、令和９年度当初予算で精算すべき不用額を算出するための確定額で、消費税資本的収支調整額等を含む。

(2) 市町負担内訳

（単位：千円）

市町名	2月現計予算(A)					決算(B)					不用額(C)＝(A)－(B)					令和6年度からの繰越予算に係る不用額	備考
	公共事業	単独事業	備品購入費	建設給与費・事務費	計	公共事業	単独事業	備品購入費	建設給与費・事務費	計	公共事業	単独事業	備品購入費	建設給与費・事務費	計		
相模原市	159,153	74,341	1,276	50,630	285,400	153,399	74,341	732	29,061	257,533	5,754	0	544	21,569	**27,867**	**264**	不用額は、令和9年度当初予算で精算予定
平塚市	70,848	33,093	541	22,537	127,019	68,288	33,093	311	12,937	114,629	2,560	0	230	9,600	**12,390**	**117**	
藤沢市	4,850	2,265	22	1,543	8,680	4,674	2,265	13	885	7,837	176	0	9	658	**843**	**8**	
茅ヶ崎市	54,506	25,460	450	17,339	97,755	52,534	25,460	259	9,952	88,205	1,972	0	191	7,387	**9,550**	**90**	
厚木市	70,849	33,093	487	22,537	126,966	68,288	33,093	281	12,937	114,599	2,561	0	206	9,600	**12,367**	**117**	
伊勢原市	10,766	5,029	69	3,424	19,288	10,377	5,029	40	1,966	17,412	389	0	29	1,458	**1,876**	**18**	
海老名市	38,116	17,804	286	12,125	68,331	36,737	17,804	165	6,960	61,666	1,379	0	121	5,165	**6,665**	**63**	
座間市	27,593	12,888	199	8,777	49,457	26,595	12,888	114	5,039	44,636	998	0	85	3,738	**4,821**	**46**	
綾瀬市	7,564	3,534	53	2,407	13,558	7,290	3,534	30	1,381	12,235	274	0	23	1,026	**1,323**	**13**	
寒川町	18,185	8,494	82	5,784	32,545	17,527	8,494	47	3,321	29,389	658	0	35	2,463	**3,156**	**30**	
大磯町	7,177	3,352	35	2,284	12,848	6,918	3,352	21	1,310	11,601	259	0	14	974	**1,247**	**12**	
愛川町	15,324	7,158	69	4,875	27,426	14,770	7,158	40	2,798	24,766	554	0	29	2,077	**2,660**	**25**	
小計（A）	484,931	226,511	3,569	154,262	869,273	467,397	226,511	2,053	88,547	784,508	17,534	0	1,516	65,715	**84,765**	**803**	
県負担（B）	484,932	226,512	4,049	224,369	939,862	467,398	226,512	2,575	133,989	830,474	17,534	0	1,474	90,380	**109,388**	**803**	
(A) ＋ (B)	969,863	453,023	7,618	378,631	1,809,135	934,795	453,023	4,628	222,536	1,614,982	35,068	0	2,990	156,095	**194,153**	**1,606**	
国費	1,297,694	-	-	-	1,297,694	1,262,625	-	-	-	1,262,625	35,069	-	-	-	**35,069**	**1,606**	
繰越金	-	-	481	6,893	7,374	-	-	481	6,893	7,374	-	-	0	0	**0**	**0**	
合計	**2,267,557**	**453,023**	**8,099**	**385,524**	**3,114,203**	**2,197,420**	**453,023**	**5,109**	**229,429**	**2,884,981**	**70,137**	**0**	**2,990**	**156,095**	**229,222**	**3,212**	

(3)事 業 内 容

上段:2月現計
下段：決算額

（単位:千円）

区分	施 設 名	金 額	内 容			図面番号
			過年度発注	令和7年度新規発注(新設)	令和7年度新規発注(改築)	
1 公共事業	(1) 幹線・ポンプ場	2,267,557 2,197,420	1. 新玉川沈砂池 伏越入口ゲート他電気設備改築工事(R5-R7)	2. 寒川平塚幹線水理検証業務委託(R7) 3. 寒川平塚幹線　用地取得(分筆登記委託費用・不動産評価・画地評価)(R7 ~~4. 寒川平塚幹線　用地取得(看板設置費用)(R7)~~ 5. 寒川平塚幹線　用地取得(不動産鑑定)(R7) ~~6. 寒川平塚幹線　用地取得(区分地上権設定)(R7)~~ ~~7. 寒川平塚幹線　用地取得(休業補償等)(R7)~~ ~~8. 寒川平塚幹線　場内整備工事①(R7)~~	9. 東豊田ポンプ場耐水化工事(R7) 10. 幹線管渠改築検討業務委託(R7) 11. 幹線管渠　点検調査業務委託(TV)(R7) 12. 橋梁等添架部管渠点検調査業務委託(R7) 56. 大規模下水道管路特別重点調査(R7) ~~57. 相模川流域下水道　幹線管渠改築工事(R7)~~ 58. 相模川流域下水道　幹線管渠改築設計業務委託(R7)	①
	(2) 左 岸 処 理 場		13. 汚泥処理施設改築工事(R6-R8) 14. 管理棟空調設備改修工事(その2)　※公共・低率(R6-R7) 15. 管理棟空調設備改修工事(その2)　※公共・高率(R6-R7) 16. 汚泥処理中央監視設備他改築工事(R6-R8) 17. 第1電気室制御電源設備改築工事(R6-R8)	18. 経営戦略変更業務委託(R7)	~~19. 用水機械設備改築工事(その2)(R7-R9)~~ ~~20. 水処理第9系列機械設備改築工事(R7-R10)~~ ~~21. 高段2,4号汚水ポンプ吐出弁改築工事(R7)~~ ~~22. 電気室空調設備改築工事　※公共・高率(R7-R8)~~ ~~23. 電気室空調設備改築工事　※公共・低率(R7-R8)~~ ~~24. No.2自家発電設備改築工事(R7-R9)~~ ~~25. No.2発電機棟築造工事(建築)(R7-R8)~~ ~~26. 用水電気設備改築工事(その2)(R7-R9)~~ ~~27. 水処理9系列電気設備改築工事(R7-R10)~~ ~~28. 水処理第1・2・3系列建築付帯電気設備改築工事(R7-R8)~~ 29. 水処理施設第1、2系列最初沈殿池耐震基本・詳細設計業務委託(R7) ~~30. 相模川流域下水道総合地震対策計画検討業務委託(R7)~~ ~~31. 旧1、2号焼却炉除却詳細設計業務委託(土木・建築)(R7)~~ 32. 下水汚泥　成分分析業務委託(R7) 33. 新2号汚泥焼却炉建設事業アドバイザリー業務委託(R7-R9) 34. ブロワ棟電気設備詳細設計業務委託(R7) ~~35. No.2発電機棟築造工事監理業務委託(R7-R8)~~ 36. 下水道機械及び電気設備機器価格実態調査業務委託(R7) 59. 流入渠A耐震詳細設計業務委託(R7) ~~60. 低段ポンプ棟耐震性基本調査(R7)~~	②
	(3) 右 岸 処 理 場		37. 水処理第6系列反応タンク機械設備改築工事(R6-R7) 38. 水処理コントローラ室制御電源改築工事(R6-R7) 39. 特高電気室直流電源改築工事(R6-R7)		40. 水処理施設耐震工事(R7) 41. 低段導水渠耐震工事(R7) 42. 放流渠耐震工事(R7) 43. 塩素混和池耐震工事(R7) 44. 低段3,4号汚水ポンプ吐出弁改築工事(R7) ~~45. 電気室空調設備他改築工事　※公共・低率(R7-R8)~~ ~~46. 電気室空調設備他改築工事　※公共・高率(R7-R8)~~ 47. ブロワ棟電気設備改築工事(R7-R9) 48. 低段電気設備改築工事(R7-R9) 49. 水処理施設第3系列最初沈殿池耐震基本・詳細設計業務委託(R7) ~~50. 低段沈砂池ポンプ棟耐震診断業務委託(R7)~~ ~~51. 水処理第4系列最初沈殿池設備改築工事設計及び耐震診断業務委託(設備改築部分)(R7-R8)~~ ~~52. 水処理第4系列最初沈殿池設備改築工事設計及び耐震診断業務委託(耐震診断部分)(R7-R8)~~ ~~53. 水処理第4系列設備改築工事設計業務委託(R7)~~ ~~54. 管理棟給排水設備改修工事設計業務委託(R7)~~ ~~55. 北系1号焼却炉電気設備改築工事詳細設計業務委託(R7)~~ 61. 水処理施設耐震工事(管廊)(R7)	③
	計	2,267,557 2,197,420				

取消し線 ― ：事業間調整により当該年度の発注見送り

(3)事 業 内 容

（単位：千円）

区分	施 設 名	金 額	内 容			図面番号
			過年度発注	令和7年度新規発注(新設)	令和7年度新規発注(改築)	
2 県単事業	(1)幹線・ポンプ場	453,023 453,023	1. 新玉川沈砂池 伏越入口ゲート他電気設備改築工事(R5-R7)	2. 寒川平塚幹線 場内整備工事②(R7)	3. 東豊田ポンプ場耐水化工事（県単分）(R7)	①
	(2)左岸処理場		4. 電気室空調設備他改築工事 ※県単分(R6-R7)	5. 場内付替水路改築工事(R7) 6. 場内付替水路耐震診断業務委託(R7) 7. 水処理施設太陽光パネル設置工事設計業務委託(R7)	8. 汚水ポンプ用電動機修理工事(R7) 9. 送風機用電動機修理工事(R7) ~~10. No.2発電機棟築造工事（建築）(R7)~~ 11. 柳島記念館照明設備更新工事(R7) 12. 管理棟長寿命化対策工事 劣化調査業務委託(R7) 13. 低段電気室設置工事基本設計業務委託(R7)	②
	(3)右岸処理場		14. 管理棟空調設備改修工事(その2) ※県単分(R6-R7)		15. 管理棟水質試験室改築工事(R7-R9) 16. 電気室空調設備他改築工事 ※県単分(R7-R8) 17. 低段電気設備改築工事(R7-R9) 18. 北系返流水管改築詳細修正設計業務委託(R7) 19. 管理棟長寿命化対策工事 劣化調査業務委託(R7) 20. 管理棟水質試験室改築工事 監理業務委託(R7-R9)	③
	計	453,023 453,023				
3 備品購入費	(1)左岸処理場	8,099 5,109		1. フェノール蒸留装置(R7) 2. 発電機(R7) 3. BOD測定装置(R7) 4. 定温乾燥機(R7) 5. ねじ切り機(R7) 6. 電動ウインチ(R7)		
	(2)右岸処理場			7. システム顕微鏡(R7) 8. 蛍光式溶存酸素計(R7)		
	(3)流域下水道整備事務所			9. シュレッダー機(R7)		
	計	8,099 5,109				
4 建設給与費・事務費	(1)処理場全体	385,524 229,429		1. 建設給与費・事務費(R7)		
	計	385,524 229,429				
総 事 業 費		3,114,203 2,884,981				

取消し線 ― ：事業間調整により当該年度の発注見送り

1 公共事業

(1)幹線・ポンプ場

(過年度発注)

1. 新玉川沈砂池 伏越入口ゲート他電気設備改築工事(R5-R7)
   新玉川沈砂池における老朽化したゲートの改築工事を行う
   0

(新設)

2. 寒川平塚幹線水理検証業務委託(R7)
   寒川平塚幹線の分水人孔構造検討及び水理検証を行う
3. 寒川平塚幹線　用地取得(分筆登記委託費用・不動産評価・画地評価)(R7)
   寒川平塚幹線に係る分筆登記、不動産評価、画地評価を行う
4. ~~寒川平塚幹線　用地取得(看板設置費用)(R7)~~
   ~~寒川平塚幹線に係る看板の設置を行う~~
5. 寒川平塚幹線　用地取得(不動産鑑定)(R7)
   寒川平塚幹線に係る不動産鑑定を行う
6. ~~寒川平塚幹線　用地取得(区分地上権設定)(R7)~~
   ~~寒川平塚幹線に係る区分地上権の設定を行う~~
7. ~~寒川平塚幹線　用地取得(休業補償等)(R7)~~
   ~~寒川平塚幹線に係る休業補償を行う~~
8. ~~寒川平塚幹線　場内整備工事①(R7)~~
   ~~寒川平塚幹線における右岸処理場内の施工基盤盤下げ、土砂検定調査等の調査、準備工を行う~~

(改築)

9. 東豊田ポンプ場耐水化工事(R7)
   東豊田ポンプ場における耐水化工事を行う
10. 幹線管渠改築検討業務委託(R7)
    圧送管周辺劣化管渠及び人孔の改築方法検討を行う
11. 幹線管渠　点検調査業務委託(TV)(R7)
    テレビカメラによる幹線管渠の点検調査を行う
12. 橋梁等添架部管渠点検調査業務委託(R7)
    橋梁添架部の圧送管渠の定期点検を行う
56. 大規模下水道管路特別重点調査(R7)
    幹線管渠の全国特別重点調査を行う
57. 相模川流域下水道　幹線管渠改築工事(R7)
    全国特別重点調査の結果に基づき、老朽化した幹線管渠の改築工事を行う
58. 相模川流域下水道　幹線管渠改築設計業務委託(R7)
    全国特別重点調査の結果に基づき、老朽化した幹線管渠を改築するための設計を行う

(2)左岸処理場

(過年度発注)

13. 汚泥処理施設改築工事(R6-R8)
    汚泥処理施設の改築工事を行う
14. 管理棟空調設備改修工事(その2)　※公共・低率(R6-R7)
    管理棟他の空調改修工事を行う
15. 管理棟空調設備改修工事(その2)　※公共・高率(R6-R7)
    管理棟他の空調改修工事を行う
16. 汚泥処理中央監視設備他改築工事(R6-R8)
    故障時代替品の無い汚泥処理中央監視設備の改築工事を行う
17. 第1電気室制御電源設備改築工事(R6-R8)
    故障時代替品の無い電気室制御電源設備の改築工事を行う

(2)左岸処理場

(新設)

18. 経営戦略変更業務委託(R7)
    経営ビジョンの見直し、変更計画の策定を行う

(改築)

19. ~~用水機械設備改築工事(その2)(R7-R9)~~
    ~~耐用年数を超え、劣化の著しい用水機械設備の改築工事を行う~~
20. ~~水処理第9系列機械設備改築工事(R7-R10)~~
    ~~耐用年数を超え、劣化の著しい水処理第9系列機械設備の改築工事を行う~~
21. ~~高段2,4号汚水ポンプ吐出弁改築工事(R7)~~
    ~~耐用年数を超え、劣化の著しい汚水ポンプ吐出弁、逆止弁の改築工事を行う~~
22. ~~電気室空調設備改築工事　※公共・高率(R7-R8)~~
    ~~電気室他の空調改修工事を行う~~
23. ~~電気室空調設備改築工事　※公共・低率(R7-R8)~~
    ~~電気室他の空調改修工事を行う~~
24. ~~No.2自家発電設備改築工事(R7-R9)~~
    ~~耐用年数を超え、劣化の著しい自家発電設備における電気設備の改築工事を行う~~
25. ~~No.2発電機棟築造工事(建築)(R7-R8)~~
    ~~耐用年数を超え、劣化の著しい自家発電設備における建築設備の築造工事を行う~~
26. ~~用水電気設備改築工事(その2)(R7-R9)~~
    ~~耐用年数を超え、劣化の著しい用水電気設備における改築工事を行う~~
27. ~~水処理9系列電気設備改築工事(R7-R10)~~
    ~~耐用年数を超え、劣化の著しい水処理第9系列電気設備の改築工事を行う~~
28. ~~水処理第1・2・3系列建築付帯電気設備改築工事(R7-R8)~~
    ~~老朽化した蛍光灯をLEDへ更新する改築工事を行う~~
29. 水処理施設第1、2系列最初沈殿池耐震基本・詳細設計業務委託(R7)
    1、2系列最初沈殿池の耐震基本・詳細設計を行う
30. 相模川流域下水道総合地震対策計画検討業務委託(R7)
    相模総合地震対策計画の第3期に向けた検討業務等を行う
31. ~~旧1、2号焼却炉除却詳細設計業務委託(土木・建築)(R7)~~
    ~~新2号焼却炉建設に向けた旧1、2号焼却炉の土木・建築の除却工事のための詳細設計を行う~~
32. 下水汚泥　成分分析業務委託(R7)
    下水汚泥の肥料化に向けた成分分析を行う
33. 新2号汚泥焼却炉建設事業アドバイザリー業務委託(R7-R9)
    新2号炉DB発注にむけての要求水準書作成業務及び事業者選定支援を行う
34. ブロワ棟電気設備詳細設計業務委託(R7)
    耐用年数を超え、劣化の著しいブロワ棟電気設備改築工事のための詳細設計を行う
35. ~~No.2発電機棟築造工事監理業務委託(R7-R8)~~
    ~~自家発電設備における建築設備工事の工事監理委託を行う~~
36. 下水道機械及び電気設備機器価格実態調査業務委託(R7)
    下水道施設の機器単価に関する市場調査を行う
59. 流入渠A耐震詳細設計業務委託(R7)
    大規模地震時においても処理場の機能を継続するために必要な流入渠の耐震詳細設計を行う
60. 低段ポンプ棟耐震性基本調査(R7)
    大規模地震時においても処理場の機能を継続するために必要な低段ポンプ棟の耐震性の基礎調査を行う

取消し線 ー ：事業間調整により当該年度の発注見送り

1　公共事業

（3）右岸処理場

（過年度発注）

37. 水処理第6系列反応タンク機械設備改築工事(R6-R7)
　　耐用年数を超え、劣化の著しい水処理設備における機械設備の改築工事を行う
~~38. 水処理コントローラ室制御電源改築工事(R6-R7)~~
　　~~故障時代替品の無い水処理コントローラ室における電気設備の改築工事を行う~~
~~39. 特高電気室直流電源改築工事(R6-R7)~~
　　~~故障時代替品の無い特高電気室における電気設備の改築工事を行う~~

（3）右岸処理場

（改築）

40. 水処理施設耐震工事(R7)
　　管廊内の耐震補強工事を行う
41. 低段導水渠耐震工事(R7)
　　右岸低段導水渠の耐震補強工事を行う
42. 放流渠耐震工事(R7)
　　右岸放流渠の耐震補強工事を行う
43. 塩素混和池耐震工事(R7)
　　塩素混和池の耐震補強工事を行う
44. 低段3,4号汚水ポンプ吐出弁改築工事(R7)
　　耐用年数を超え、劣化の著しい吐出弁、逆止弁の改築工事を行う
~~45. 電気室空調設備他改築工事　※公共・低率(R7-R8)~~
　　~~電気室他空調設備の改築工事を行う~~
~~46. 電気室空調設備他改築工事　※公共・高率(R7-R8)~~
　　~~電気室他空調設備の改築工事を行う~~
47. ブロワ棟電気設備改築工事(R7-R9)
　　耐用年数を超え、劣化の著しいブロワ棟における電気設備の改築工事を行う
48. 低段電気設備改築工事(R7-R9)
　　耐用年数を超え、劣化の著しい電気設備の改築工事を行う
49. 水処理施設第3系列最初沈殿池耐震基本・詳細設計業務委託(R7)
　　右岸処理場における最初沈殿池耐震補強工事のための基本設計・詳細設計を行う
50. 低段沈砂池ポンプ棟耐震診断業務委託(R7)
　　右岸処理場における低段沈砂池ポンプ棟の耐震診断を行う
~~51. 水処理第4系列最初沈殿池設備改築工事設計及び耐震診断業務委託(設備改築部分)(R7-R8)~~
　　~~耐用年数を超え、劣化の著しい水処理第4系列最初沈殿池設備の改築工事のための詳細設計を行う~~
~~52. 水処理第4系列最初沈殿池設備改築工事設計及び耐震診断業務委託(耐震診断部分)(R7-R8)~~
　　~~水処理第4系列最初沈殿池の耐震診断を行う~~
~~53. 水処理第4系列設備改築工事設計業務委託(R7)~~
　　~~耐用年数を超え、劣化の著しい水処理第4系列設備改築の改築工事のための詳細設計を行う~~
~~54. 管理棟給排水設備改修工事設計業務委託(R7)~~
　　~~耐用年数を超え、劣化の著しい管理棟給排水設備改築工事のための詳細設計を行う~~
~~55. 北系1号焼却炉電気設備改築工事詳細設計業務委託(R7)~~
　　~~故障時代替品の無い焼却炉改築工事のための詳細設計を行う~~
61. 水処理施設耐震工事（管廊）(R7)
　　大規模地震時においても処理場の機能を継続するために必要な低段ポンプ棟の耐震性の基礎調査を行う

取消し線 ー ：事業間調整により当該年度の発注見送り

2 単独事業

(1)幹線・ポンプ場

(過年度発注)

1. 新玉川沈砂池 伏越入口ゲート他電気設備改築工事(R5-R7)
   新玉川沈砂池における老朽化したゲートの改築工事を行う

(新設)

2. 寒川平塚幹線　場内整備工事②(R7)
   寒川平塚幹線における右岸処理場内の施工基盤盤下げ、土砂検定調査等の調査、準備工を行う

(改築)

3. 東豊田ポンプ場耐水化工事(県単分)(R7)
   東豊田ポンプ場における耐水化工事を行う

(2)左岸処理場

(過年度発注)

4. 電気室空調設備他改築工事　※県単分(R6-R7)
   電気室他の空調改修工事を行う

(新設)

5. 場内付替水路改築工事(R7)
   左岸処理場内付替水路BOX(松尾川)の人孔嵩上げを行う
6. 場内付替水路耐震診断業務委託(R7)
   左岸処理場内付替水路BOX(松尾川)の耐震診断を行う
7. 水処理施設太陽光パネル設置工事設計業務委託(R7)
   ロードマップに則り、太陽光発電設備設置の詳細設計を行う

(改築)

8. 汚水ポンプ用電動機修理工事(R7)
   汚水ポンプ用電動機の改築工事を行う
9. 送風機用電動機修理工事(R7)
   送風機用電動機の改築工事を行う
10. No.2発電機棟築造工事(建築)(R7)
    耐用年数を超え、劣化の著しい自家発電設備における建築設備の築造工事を行う
11. 柳島記念館照明設備更新工事(R7)
    照明器具のLED化工事を行う
12. 管理棟長寿命化対策工事　劣化調査業務委託(R7)
    管理棟長寿命化に係る劣化調査を行う
13. 低段電気室設置工事基本設計業務委託(R7)
    低段電気室設置場所についての見直し設計を行う

(3)右岸処理場

(過年度発注)

14. 管理棟空調設備改修工事(その2)　※県単分(R6-R7)
    管理棟における空調設備の改築工事を行う

(改築)

15. 管理棟水質試験室改築工事(R7-R9)
    水質試験室の改築工事を行う
16. 電気室空調設備他改築工事　※県単分(R7-R8)
    電気室他空調設備の改築工事を行う
17. 低段電気設備改築工事(R7-R9)
    低段電気設備の改築工事を行う
18. 北系返流水管改築詳細修正設計業務委託(R7)
    右岸北系汚泥処理施設からの返流水管の改築詳細修正設計を行う
19. 管理棟長寿命化対策工事　劣化調査業務委託(R7)
    管理棟長寿命化に係る劣化調査を行う
20. 管理棟水質試験室改築工事 監理業務委託(R7-R9)
    水質試験室の改築工事に係る監理を行う

取消し線 ー : 事業間調整により当該年度の発注見送り


①令和７年度 相模川流域下水道事業 幹線管渠計画平面図




管渠進捗率			
施設名	全体計画m	令和４年度まで	
		完成延長m	進捗率%
左岸幹線	35,860	35,740	99.7%
〃（拡大分）	22,320	22,320	100%
座間海老名幹線	11,520	11,520	100%
綾瀬寒川幹線	7,110	7,110	100%
藤沢寒川幹線	7,360	7,360	100%
茅ヶ崎幹線	3,980	3,980	100%
戸沢幹線	1,440	1,440	100%
寒川平塚幹線	1,470		0%
右岸幹線	22,700	22,700	100%
平塚幹線	3,030	3,030	100%
伊勢原厚木幹線	1,650	1,650	100%
大磯平塚幹線	9,310	9,310	100%

凡例	
	令和６年度迄施工済箇所
	令和７年度施工予定箇所
	令和８年度以降着工予定箇所
○	公共事業
◆	単独事業

②令和７年度 相模川流域下水道 左岸処理場 計画平面図

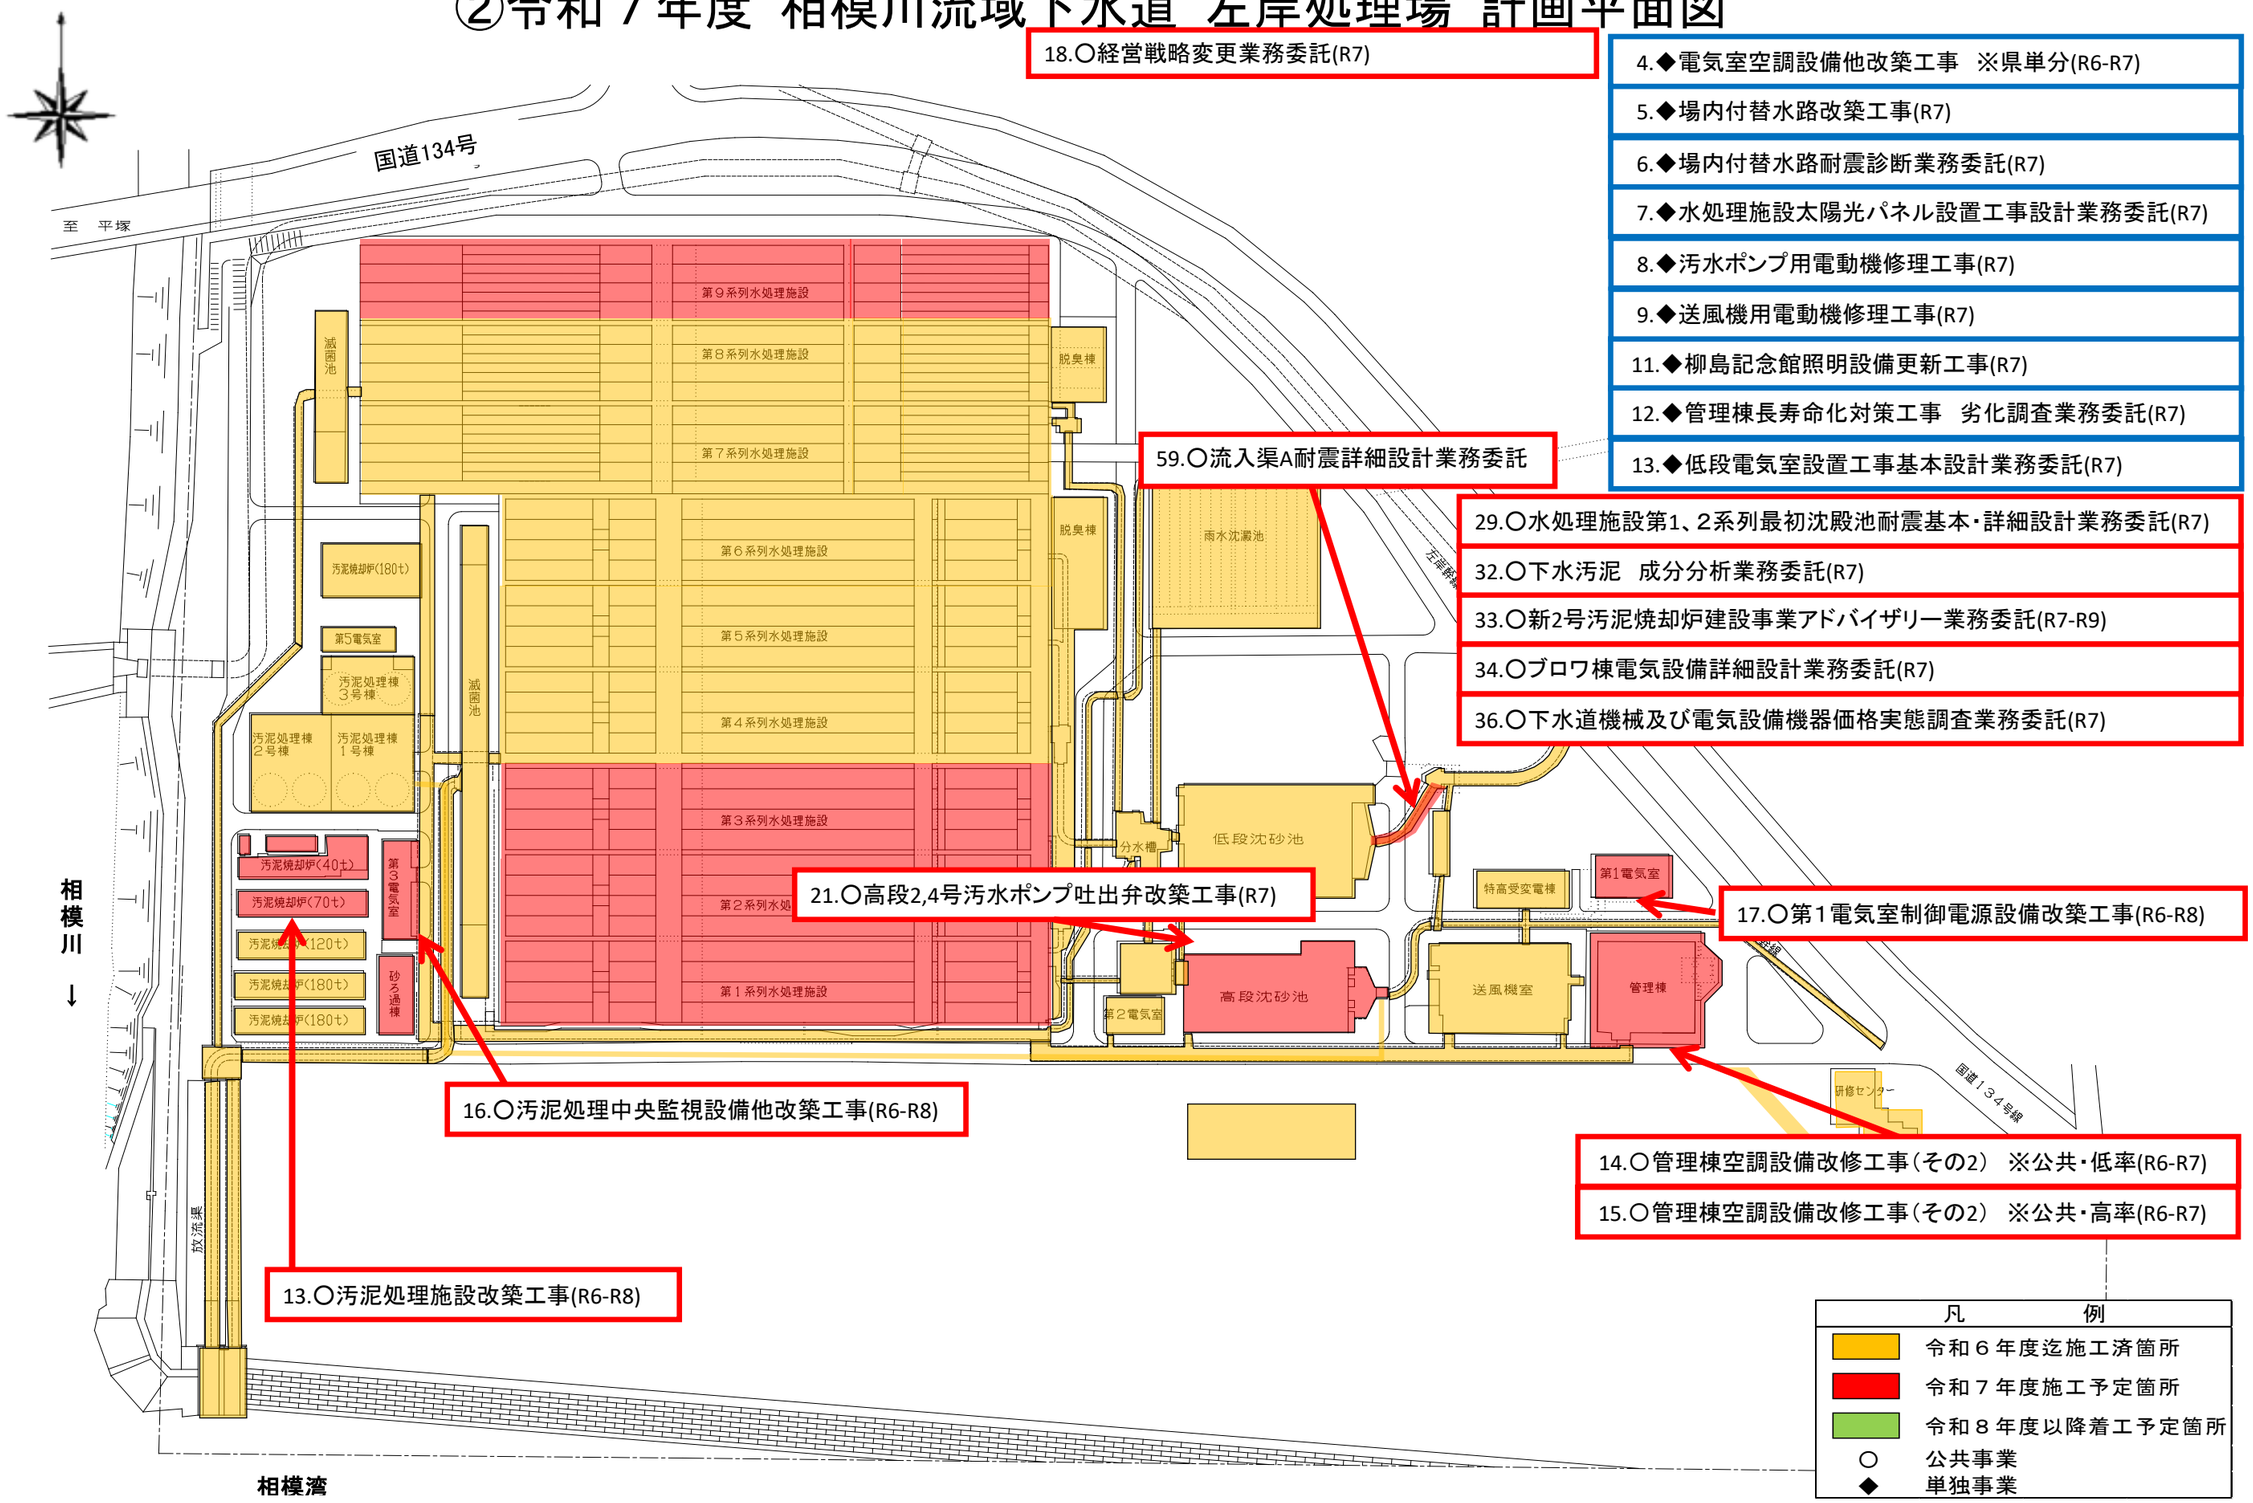

③令和７年度 相模川流域下水道 右岸処理場 計画平面図

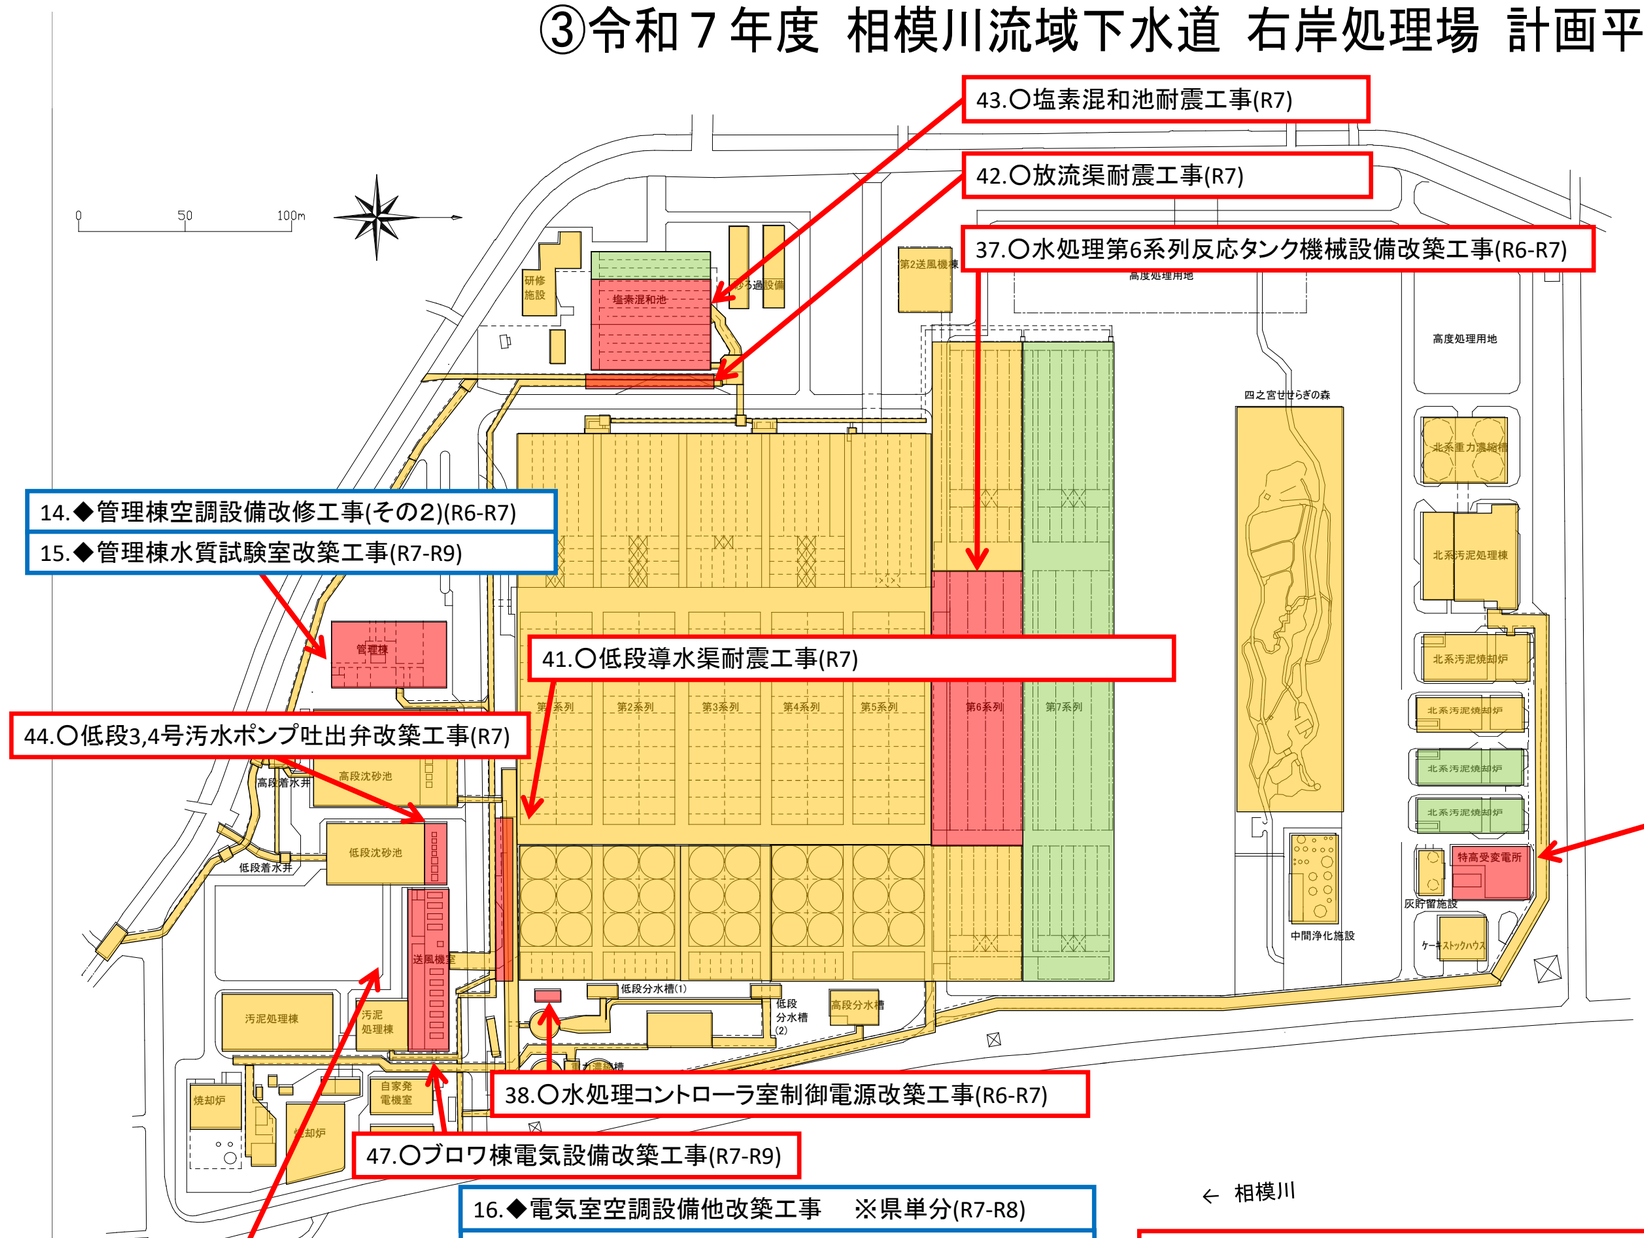

凡　例

- 令和６年度迄施工済箇所
- 令和７年度施工予定箇所
- 令和８年度以降着工予定箇所
- ○ 公共事業
- ◆ 単独事業

43.○塩素混和池耐震工事(R7)

42.○放流渠耐震工事(R7)

37.○水処理第6系列反応タンク機械設備改築工事(R6-R7)

14.◆管理棟空調設備改修工事(その2)(R6-R7)

15.◆管理棟水質試験室改築工事(R7-R9)

41.○低段導水渠耐震工事(R7)

44.○低段3,4号汚水ポンプ吐出弁改築工事(R7)

39.○特高電気室直流電源改築工事(R6-R7)

38.○水処理コントローラ室制御電源改築工事(R6-R7)

47.○ブロワ棟電気設備改築工事(R7-R9)

48.○低段電気設備改築工事(R7-R9)

17.◆低段電気設備改築工事(R7-R9)

16.◆電気室空調設備他改築工事　※県単分(R7-R8)

18.◆北系返流水管改築詳細修正設計業務委託(R7)

19.◆管理棟長寿命化対策工事　劣化調査業務委託(R7)

20.◆管理棟水質試験室改築工事 監理業務委託(R7-R9)

← 相模川

40.○水処理施設耐震工事(R7)

49.○水処理施設第３系列最初沈殿池耐震基本・詳細設計業務委託(R7)

61.○水処理施設耐震工事(管廊)(R7)
